



Casa Buneo - studio associato

A pascolati.it
Studio

mlr
Matteo La Rocca
Architetto

Città di Asti



COMMITTENTE

COMUNE DI ASTI

PROGETTISTA

ARCH. PIERGIORGIO PASCOLATI

CUP G31B21007080002 - CIG 8992346EA8 – SCHEDA
612/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ADEGUAMENTO CPI
COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTUALE ED
ESECUTIVA E C.R.E. RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE
DI DUE NUOVE PALESTRE SCOLASTICHE ALL'INTERNO DEL
FABBRICATO DENOMINATO "EX ENOFILA"




• **ALLEGATO A**
Diagramma di Gantt
(Cronoprogramma dei lavori)

PSC

Data: 9 febbraio 2021

Scala: /

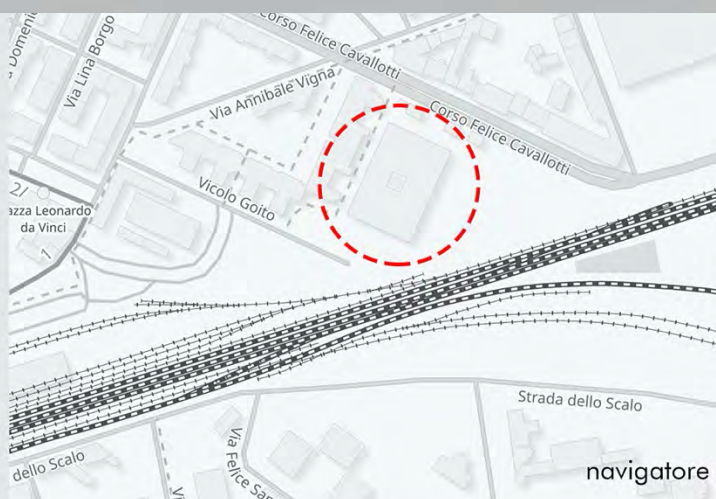

arch. PIERGIORGIO PASCOLATI
Piazza Cattedrale, 12 – 14100 Asti
tel. +39-0141 320436 +393356831468
Indirizzo e-mail: ppascolati@pascolati.it

arch. MATTEO LA ROCCA
Via Giovanni Rosa n°7, 14100 Asti (AT)
tel. 3385642645
Indirizzo e-mail: matteolarocca@pascolati.it



ALLEGATO "A"

Comune di ASTI
Provincia di AT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: CUP G31B21007080002 - CIG 8992346EA8 _ SCHEDA 612/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ADEGUAMENTO CPI COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTUALE ED ESECUTIVA E C.R.E. RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI DUE NUOVE PALESTRE SCOLASTICHE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX ENOFILA"

COMMITTENTE: COMUNE DI ASTI.

CANTIERE: Corso Felice Cavallotti, 45, ASTI (AT)

Asti, 09/02/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Pascolati Piergiorgio)

per presa visione

IL COMMITTENTE



























(R.U.P. Carantoni Paolo)



Casa Buneo - studio associato

A pascolati.it
Studio

mlr
Matteo La Rocca
Architetto

Nome attività	Durata	Agosto 2022	Settembre 2022				Ottobre 2022				Novembre 2022				Dicembre 2022				Gennaio 2023				Febbraio 2023						
		29/08	05/09	12/09	19/09	26/09	03/10	10/10	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	30/01	06/02	13/02	20/02		
Allestimento del cantiere	7 g																												
Preparazione delle aree di cantiere	1 g																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi	1 g																												
Apprestamenti del cantiere	3 g																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio	1 g																												
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g																												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali	1 g																												
Impianti di servizio del cantiere	3 g																												
Realizzazione di impianto di messa a terra	1 g																												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																												
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g																												
Realizzazione di impianto d'illuminazione del cantiere	1 g																												
Demolizioni, Rimozioni, tagli	20 g																												
Demolizioni	2 g																												
Demolizione eseguita a mano	2 g																												
Demolizione di tramezzature eseguite a mano	2 g																												
Demolizione eseguita con mezzi meccanici	2 g																												
Demolizione di tramezzature eseguite con mezzi meccanici	2 g																												
Rimozioni	13 g																												
Rimozione di impianti	10 g																												
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	1 g																												
Rimozione di impianti elettrici	3 g																												
Rimozione di impianti idrico-sanitari	2 g																												
Rimozione di caldaia a basamento	2 g																												
Rimozione di apparecchi illuminanti	2 g																												
Rimozione di canali di ventilazione	2 g																												

Nome attività	Durata	Agosto 2022	Settembre 2022				Ottobre 2022				Novembre 2022				Dicembre 2022				Gennaio 2023				Febbraio 2023				
		29/08	05/09	12/09	19/09	26/09	03/10	10/10	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	30/01	06/02	13/02	20/02
Rimozione di pavimenti	2 g																										
Rimozione di pavimento in ceramica	2 g																										
Rimozione di rivestimenti	2 g																										
Rimozione di rivestimenti in ceramica	2 g																										
Rimozione di serramenti	1 g																										
Rimozione di serramenti interni	1 g																										
Smontaggi	5 g																										
Smontaggio controsoffitto esistente	5 g																										
Opere edili interne	71 g																										
Massetti e sottofondi	5 g																										
Formazione di massetto per pavimenti inter	5 g																										
Pareti divisorie, controsoffittature	39 g																										
Realizzazione di tramezzature interne	5 g																										
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	5 g																										
Applicazione interna di pannelli isolanti su :	5 g																										
Posa di rete a protezione del controsoffitto	5 g																										
Intonaci	10 g																										
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5 g																										
Rasatura di intonaci interni	5 g																										
Pavimentazioni interne	14 g																										
Posa di pavimenti per interni in ceramica	2 g																										
Posa di pavimenti per interni in materie pla	10 g																										
Rivestimenti interni	2 g																										
Posa di rivestimenti interni in ceramica	2 g																										
Pitturazioni interne	5 g																										
Tinteggiatura di superfici interne	5 g																										

Nome attività	Durata	Agosto 2022	Settembre 2022				Ottobre 2022				Novembre 2022				Dicembre 2022				Gennaio 2023				Febbraio 2023																
		29/08	05/09	12/09	19/09	26/09	03/10	10/10	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	30/01	06/02	13/02	20/02												
Serramenti	66 g								<div></div>																														
Posa di controtelai per serramenti interni	2 g								2																														
Montaggio di porte interne	5 g																				5																		
Impianti tecnici	71 g								<div></div>																														
Assistenze murarie per impianti	4 g																																						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	4 g									4																													
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi m	4 g									4																													
Impianti d'illuminazione	10 g																				<div></div>																		
Installazione di corpi illuminanti	5 g																				5																		
Realizzazione di impianto di illuminazione c	5 g																			5																			
Impianti elettrici	5 g																				<div></div>																		
Realizzazione di impianto elettrico	4 g																				4																		
Realizzazione di impianto di messa a terra	1 g																			1																			
Impianti idrico-sanitario	52 g												<div></div>																										
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	5 g																					5																	
Realizzazione della rete di distribuzione di i	5 g											5																											
Impianti per la qualità dell'aria indoor	5 g											<div></div>																											
Realizzazione di impianto di ventilazione fo	5 g											5																											
Impianti termici	61 g								<div></div>																														
Installazione impianto termico	5 g																				5																		
Realizzazione della rete di distribuzione e p	10 g								10																														
Smobilizzo del cantiere	5 g																					<div></div>																	
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggi	2 g																					2																	
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g																						2																
Smobilizzo del cantiere	1 g																						1																
