

**RICHIESTA MODIFICA / SOSTITUZIONE OBIETTIVO/I  
PERFORMANCE / PEG / PDO 2018/2020**

**Settore PATRIMONIO, AMBIENTE E RETTI**

**Dirigente Arch. Antonio Scaramozzino**

Al Sig. Sindaco  
Alla Giunta  
Al Segretario Generale

n. 3 (numerazione interna)	Descrizione obiettivo (peso 15)	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
901010201	Avvio indagini di monitoraggio del territorio per difesa suolo (frane/ri/ video ispezione condotte acque bianche) finalizzato alla pianificazione e gestione strategica della prevenzione del dissesto idrogeologico in coordinamento con <i>LL.PP. - Urbanistica - ASP</i>	Avvio indagini di monitoraggio del territorio per difesa suolo entro 31.12.2018	.....	Scheda 989 euro 50.000 sul 2018: (entrate patrimoniali). Al 19.9.2018: verificato con Ragioneria: la scheda NON è finanziabile. Ad oggi NON avviate indagini di monitoraggio del territorio per difesa suolo per impossibilità conferimento incarico
901010201	Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete acque bianche esistenti e ri	-	Aggiudicazione ed inizio lavori di cui all'obiettivo entro 31/12/2018	Sostituire con obiettivo Piano Programma sch 176 (euro 50.000 impegnati da ufficio Progettazione ambientale con Dgc 198 del 4/5/2018 di approvazione progetto esecutivo; aggiudicazione con efficacia in corso)

**Si richiede la sostituzione / modifica con il seguente nuovo obiettivo:**



n. 4	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------

901020101	Esecuzione Contratto di Servizio per la regolamentazione del servizio di igiene urbana in collaborazione con il Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi e Ufficio Legale	Redazione nuovo contratto di servizio Igiene Urbana 2018-2028 entro 31.12.2018	Controllo gestionale e contabile del contratto di Igiene Urbana in proroga e avvio di tavoli tecnici per la ridefinizione del nuovo contratto	Come da Relazione al Rendiconto 2017 dei Revisori: in attesa esito Analisi Governance - Studio Università - per indirizzi e successiva redazione Contratti con ASP. Il Settore PAR ha effettuato le verifiche tecnico-contabili previste dal Contratto in essere (in proroga da 2016) e ha fatto incontri per la definizione tecnico operativa del nuovo servizio di raccolta differenziata di prossimità
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n. 5	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
907020101	Rispetto delle normative ed attuazione di eventuali ordinanze su indicazione di Regione e Provincia	Redazione di ordinanze su indicazione di Regione e Provincia	Attività propedeutiche al monitoraggio della qualità dell'aria con Arpa e Provincia finalizzate all'avvio dell'iter istruttorio per l'eventuale adozione di ordinanze (su indicazione di Regione e Provincia)	A seguito di comunicazioni del Settore PAR, in relazione all'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, che prevede chiusure al traffico a seguito superamento limiti PM10 (Asti: storicamente superiori a 35 giorni/anno, limite ammesso da normativa), l'Amministrazione ha deciso di non avviare procedure di chiusure del traffico in tutta tutta la zona urbana ma ha limitato il traffico cittadino nella zona del centro storico, in occasione di particolari criticità In alternativa ha attivato un piano di monitoraggio con ARPA con centraline mobili in zone ad alto traffico al fine di ottenere dati precisi sulla qualità?



dell'aria. Sono state posizionate centraline mobili in o più zone cittadine e siamo in attesa dei dati rilevati. Saranno pronti per un prossimo convegno di novembre

<b>n. 6</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>Indicatore ante modifiche</b>	<b>Indicatore post modifiche</b>	<b>Motivazione adeguata</b>
-------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

909030101	Studio di fattibilità per l'introduzione di diversa metodologia di raccolta differenziata di prossimità per le tipologie di rifiuto: multimateriale, indifferenziato e carta in collaborazione con <i>Ragioneria</i>	Approvazione studio di fattibilità: entro 30.6.2018 affinché ASP possa procedere alla fase operativa del progetto con esecutività da 1.1.2019	Svolgimento tavoli tecnici con ASP per l'approvazione dello studio di fattibilità di cui all'obiettivo, finalizzati all'ottenimento delle integrazioni richieste ed alla condivisione con i settori Ragioneria Bilancio ed Affari Legali	Lo studio di fattibilità è stato presentato da ASP ed è stato oggetto di numerose richieste di integrazione e specifiche valutazioni economiche, sui contenuti e sulle tempistiche contrattuali, in collaborazione con il settore Ragioneria e Bilancio/Rapporti con partecipate ed Affari Legali. Lo studio non è ancora stato approvato perché in attesa delle dovute integrazioni.
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>n. 7</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>Indicatore ante modifiche</b>	<b>Indicatore post modifiche</b>	<b>Motivazione adeguata</b>
-------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

.....	Obiettivo di sintesi costituito da tutti gli altri obiettivi gestionali approvati nel PEG/PdO 2018/2020 VEDERE DETTAGLIO DI SEGUITO	Insieme degli indicatori dei singoli obiettivi gestionali approvati nel PEG/PdO 2018/2020 VEDERE DETTAGLIO DI SEGUITO	.....	NB altri obiettivi gestionali PEG/PdO:
<b>n. 7A</b>	Descrizione obiettivo	Indicatore ante modifiche	<b>Indicatore post modifiche</b>	Motivazione adeguata

107050101	Anno 2018 - Avvio delle procedure per alienazione di: 1) Viale Pilone, locale ad uso tripperia - 2) Mercato coperto, ex croce verde	Entro 31.12.2018	.....	Attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazione - avvio procedure per alienazione di: Viale Pilone, locale ad uso tripperia e Mercato coperto, ex Croce Verde:
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<p>L'Amministrazione comunale intende stralciare gli immobili dal Piano di Alienazione e procedere ad ulteriori valutazioni sul loro utilizzo</p> <p>RICHIEDERE MODIFICA OBIETTIVO</p> <p>ATTENZIONE: OBIETTIVI 107050102 non modificati perché sussistenti, anche se afferenti al Piano alienazioni</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si richiede la sostituzione / modifica con il seguente nuovo obiettivo:

<p><b>non riconducibile ad obiettivo di DUP</b></p>	<p>Publicitare manifestazioni di interesse per rotonde indicate dall'Amministrazione</p>	-	<p>Redazione e pubblicazione della manifestazione di interesse (1° avviso) entro 31/3/2018</p> <p>Redazione e stipula convenzioni per gestione rotatorie agli aggiudicatari selezionati da LLPP entro 31/7/2018</p> <p>Redazione e pubblicazione della manifestazione di interesse (2° avviso) entro 31/7/2018</p>	<p>A seguito della formulazione di indirizzi guida per l'affidamento a privati della gestione delle rotatorie astigiane (obiettivo intersettoriale con LLPP), avvenuta con DGC 595 del 5/12/2017, si sono effettuate:</p> <p>1° manifestazione interesse per tot 11 rotatorie, conclusa il 6/2/2018: perfezionamento 7 contratti concluso il 25/5/2018.</p> <p>2° manifestazione per le restanti 4 rotatorie + ulteriori rotatorie (tot 11 rotatorie): conclusa il 15/5/2018</p> <p>Attività sulla 2° manifestazione subordinata ad attività di esame risultanze da parte dei LLPP (già sollecitata)</p>
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n. 7B	Descrizione obiettivo	Indicatore ante modifiche	Indicatore post modifiche	Motivazione adeguata
101020101	<p>Esecuzione Contratto di Servizio per la regolamentazione del sistema integrato dei servizi alla mobilità in collaborazione con il Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi e Ufficio Legale</p>	<p>Redazione nuovo contratto di servizio Mobilità 2018-2028 entro 31.12.2018</p>	<p>Controllo gestionale e contabile del contratto di servizio Mobilità in proroga e avvio di tavoli tecnici per la ridefinizione del nuovo contratto</p>	<p>Come da Relazione al Rendiconto 2017 dei Revisori: in attesa esito Analisi Governance - Studio Università - per indirizzi e successiva redazione Contratti con ASP.</p> <p>Il Settore PAR ha effettuato le verifiche tecnico-contabili previste dal Contratto in essere (in proroga da</p>

2016) e partecipato ad incontri presso AMP e Commissione tecnica di Bacino Sud-Est per la definizione tecnico operativa del contratto.


Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Asti, 11/10/2018

Il Dirigente  
Arch. Antonio Scaramozzino

Visto l'Assessore Stefania Morra

l'Assessore Marcello Coppo

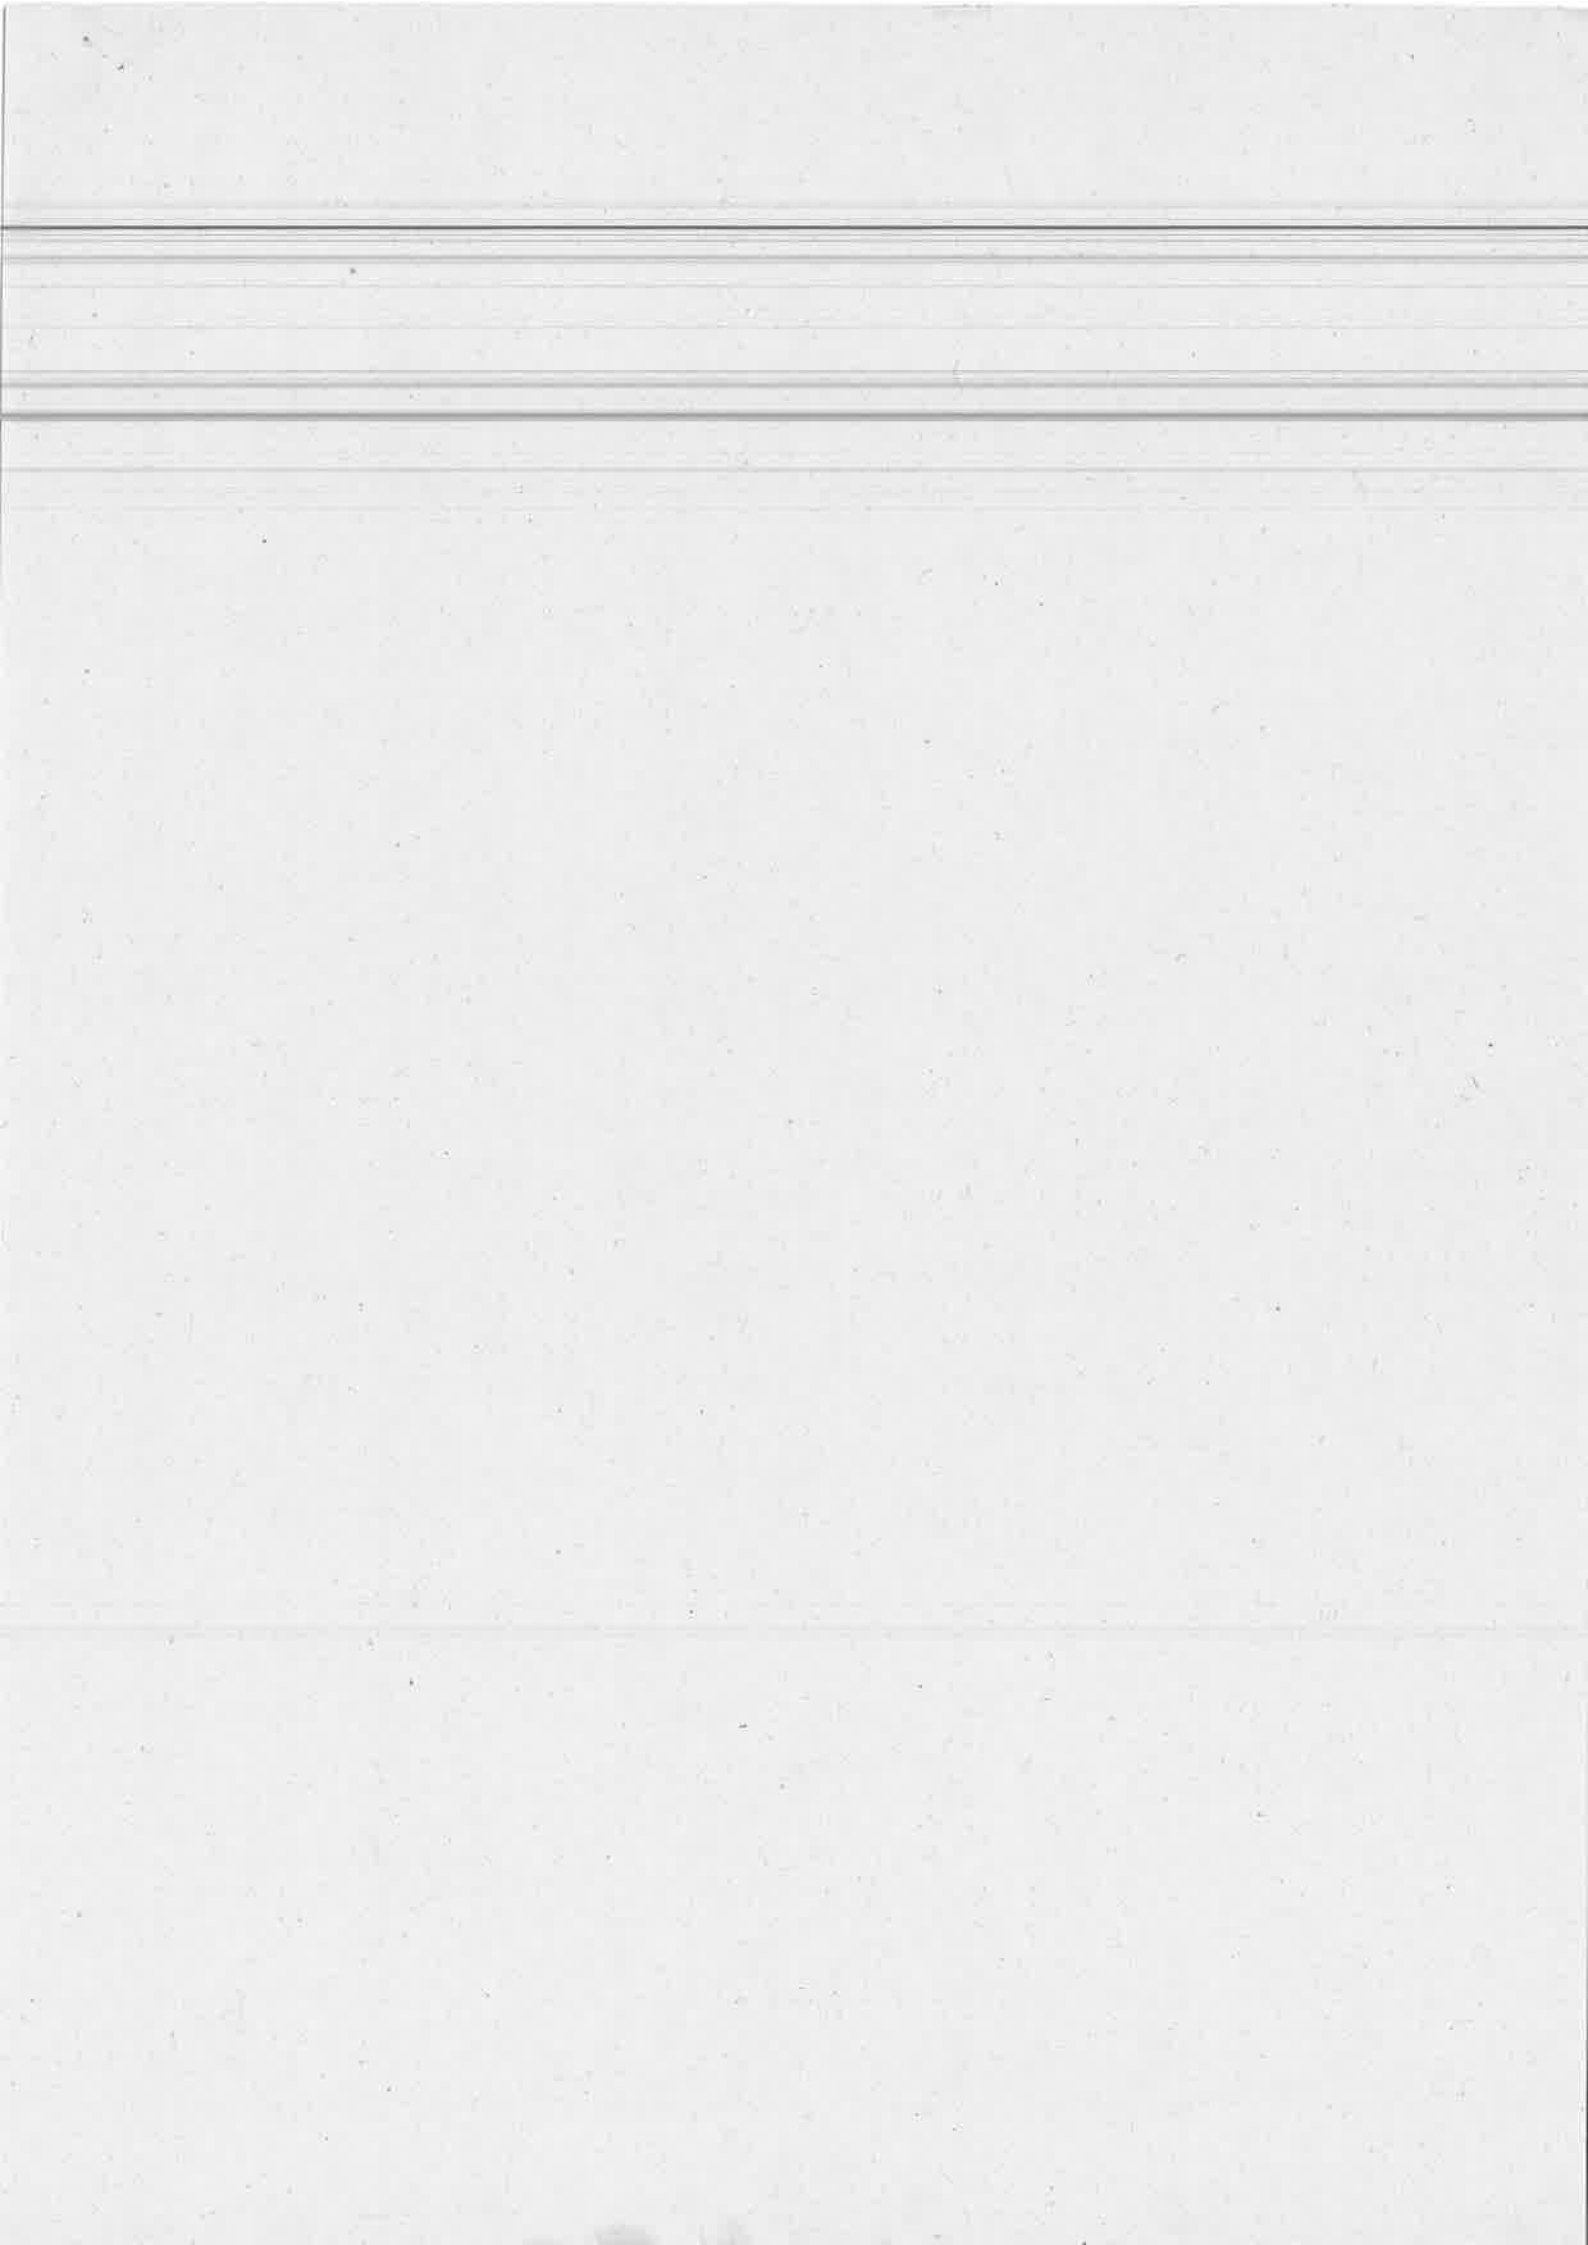

**RICHIESTA MODIFICA / SOSTITUZIONE OBIETTIVO/  
PERFORMANCE / PEG / PdO 2018/2020**

**Settore URBANISTICA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Dirigente Angelo Demarchis**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
1405050202	<p>(Azione) Collaborazione con il Servizio Software e Archivio/Protocollo nell'esame e nella gestione di un'eventuale proposta di partenariato pubblico privato di servizi informatici, per la sola parte riguardante la predisposizione di un portale informatico dedicato all'e-commerce delle imprese astigiane</p>	<p>SI/NO</p>	<p>.....</p>	<p>La proposta di partenariato pubblico privato di servizi informatici presentata dalla società DEDALUS il 20.06.2018 richiede molteplici valutazioni sotto i profili amministrativo/legale, finanziario ed informatico che non consentono, al momento, di ipotizzarne una positiva conclusione in tempi brevi. Pur fornendo, come Settore Urbanistica ed Attività Produttive, la dovuta collaborazione con il Servizio Software e Archivio/Protocollo per l'approfondimento della proposta per gli aspetti di</p>

				competenza, si ritiene opportuno ridefinire l'azione autonomamente da essa.
1405050202	(Azione) Collaborazione con il Servizio Software e Archivio/Protocollo nell'esame e nella gestione di una proposta di fornitura di software informatico per la predisposizione di un portale informatico dedicato all'e-commerce delle imprese astigiane	-	SI/NO	

**Si richiede la sostituzione / modifica con il seguente nuovo obiettivo:**

Asti, 11.10.2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Il Dirigente  
Arch. Angelo Demarchis



Visto l'Assessore Avv. Marcello Coppo





**RICHIESTA MODIFICA PERFORMANCE 2018/2020**

Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica

Dirigente Ing. Paolo Toscano

Al Sig. Sindaco

Alla Giunta

Al Segretario Generale


n.	Descrizione obiettivo strategico	TARGHET 2018	TARGHET 2018 <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
6.05	Evitare la costruzione di inutili "cattedrali nel deserto" favorendo, invece, la realizzazione di impianti di piccole e medie dimensioni, sia nel centro, sia nelle zone periferiche, dove si potrebbero riqualificare i capannoni dismessi approntando, con pochi interventi di messa a norma, impianti disponibili in breve tempo	Riqualificazione piattaforma sportiva polifunzionale ex Ferriere Ercole	Riqualificazione piattaforma sportiva polifunzionale ex Ferriere Ercole : approvazione progetto esecutivo entro 31/12/2018	<p>Ai sensi dell'art. 13 c. 1, del <u>Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91</u>, "l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del Decreto del <u>Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017</u>, pubblicato in <u>GU n. 148 del 27 giugno 2017</u>, nonché delle Delibere del <u>CIPe n. 2 del 3 marzo 2017</u> e <u>n. 72 del 7 agosto 2017</u>, 7 adottate ai sensi dell'art.1 c. 141 <u>Legge 11 dicembre 2016 n. 232</u>, e' differita <u>all'anno 2020</u>.</p> <p><i>Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione".</i></p> <p>A fronte di quanto sopra evidenziato, l'indicatore, riferito all'obiettivo in oggetto, e' pertanto rimodulato alla data del 31/12/2018.</p>

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Il Dirigente  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Mario Bovino

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Bovino', written over the printed name of the assessor.

**RICHIESTA MODIFICA PERFORMANCE 2018/2020**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

n.	Descrizione obiettivo strategico	TARGHET 2018	TARGHET 2018 <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
5.01	Cultura: Attuare una ricognizione e una mappatura il più possibile completa dei beni e delle attività culturali astigiane, prevedendo e promuovendo dove sia necessario interventi restaurativi e conservativi, accedendo a finanziamenti regionali ed europei	Affidamento incarichi di progettazione	Indizione gare per affidamenti incarichi di progettazione	Disciplinare relativo al POR FESR Asse 6 è stato aggiornato con DDR 318 del 24/07/2018. Questa modifica ha comportato una rimodulazione della tempistica

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Il Dirigente

Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore ing. Stefania Morta

**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

<b>n.</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>Indicatore ante modifiche</b>	<b>Indicatore post modifiche</b>	<b>Motivazione adeguata</b>
112060103	scheda 655/2017 - riqualificazione palestra di via Monti (periferie)	31/12/2018 – aggiudicazione lavori	31/12/2018 – approvazione progetto esecutivo	Ai sensi dell'art. 13 c. 1, del <u>Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91</u> , “ <u>l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato in GU n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle Delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'art.1 c. 141 Legge 11 dicembre 2016 n. 232, e' differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione</u> ”. A fronte di quanto sopra evidenziato, l'indicatore, riferito all'obiettivo in oggetto, e' pertanto rimodulato alla data del 31/12/2018.


**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE**

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

  
Il Dirigente  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
112060104	scheda 198/2018 - interventi di ristrutturazione relativi a efficientamento energetico , miglioramento sismico e adeguamento normativo di Palazzo Mandela	31/12/2018 – firma contratto d'appalto	31/12/2018 - Determinazione indizione lavori	Ritardo con cui Regione Piemonte ha visionato il progetto esecutivo

**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE**

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

  
Il Dirigente  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA ELIMINAZIONE OBIETTIVO / PEG / PdO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

Si richiede l'eliminazione del sottoindicato obiettivo in quanto riportato nell'obiettivo strategico 6.05 – CDC 6141 Impianti sportivi – obiettivo 605010101

<b>n.</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>Motivazione adeguata</b>
112060104	scheda 654/2018 - riqualificazione piattaforma sportiva polifunzionale ex ferriere Ercole (periferie)	obiettivo già presente (vedi n. 605010101)

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Il Dirigente  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra

## RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO PEG / PDO 2018

Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica

Dirigente Ing. Paolo Toscano

Al Sig. Sindaco

Alla Giunta

Al Segretario Generale

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
112060104	scheda 478/2018 - tetto scuola Oberdan	31/12/2018 – firma contratto d'appalto	31/12/2018 - Determinazione a contrattare	Ritardo con cui la Cassa Deposito e Prestiti ha autorizzato il mutuo

SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL'INDICATORE POST MODIFICHE

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Al Dirigente  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra





**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PAO 2018**

Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica

Dirigente Ing. Paolo Toscano

Al Sig. Sindaco

Alla Giunta

Al Segretario Generale

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
112060104	scheda 488/2048 - riqualificazione energetica - miglioramento della sicurezza e abbattimento barriere architettoniche scuola Lina Borgo (periferie)	31/12/2018 - Determinazione a contrattare	31/12/2018 – approvazione progetto esecutivo	<p>Ai sensi dell'art. 13 c. 1, del <u>Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91</u>, “<i>l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato in GU n. 148 del 27 giugno 2017, nonchè delle Delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'art.1 c. 141 Legge 11 dicembre 2016 n. 232, e' differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione</i>”.</p> <p>A fronte di quanto sopra evidenziato, l'indicatore, riferito all'obiettivo in oggetto, e' pertanto rimodulato alla data del 31/12/2018.</p>

**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE**


Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

  
Il Dirigente

Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante modifiche</i>	Indicatore <i>post modifiche</i>	Motivazione adeguata
112060104	scheda 489/2018 - riqualificazione e ampliamento spogliatoi palestra scuola Jona (periferie)	31/12/2018 - Determinazione a contrattare	31/12/2018 – approvazione progetto esecutivo	<p>Ai sensi dell'art. 13 c. 1, del <u>Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91</u>, "l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del <u>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017</u>, pubblicato in <u>GU n. 148 del 27 giugno 2017</u>, nonché delle <u>Delibere del CIP E n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017</u> adottate ai sensi dell'art.1 c. 141 <u>Legge 11 dicembre 2016 n. 232</u>, e' <u>differita all'anno 2020.</u></p> <p><i>Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione".</i></p> <p>A fronte di quanto sopra evidenziato, l'indicatore, riferito all'obiettivo in oggetto, e' pertanto rimodulato alla data del 31/12/2018.</p>


SI RICHIESTE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL'INDICATORE POST MODIFICHE

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

  
Il Dirigente  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Inq. Stefania Morra



## RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018

Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica

Dirigente Ing. Paolo Toscano

Al Sig. Sindaco

Alla Giunta

Al Segretario Generale

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
112060104	scheda 490/2018 - riqualificazione e ampliamento scuola De Benedetti (periferie)	31/12/2018 - Determinazione a contrattare	31/12/2018 – approvazione progetto esecutivo	Ai sensi dell'art. 13 c. 1, del <u>Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91</u> , "l'efficacia delle <u>convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato in GU n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle Delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'art.1 c. 141 Legge 11 dicembre 2016 n. 232, e' differita all'anno 2020.</u> <u>Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione".</u> A fronte di quanto sopra evidenziato, l'indicatore, riferito all'obiettivo in oggetto, e' pertanto rimodulato alla data del 31/12/2018.

**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE**

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

  
Il Dirigente

Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante modifiche</i>	Indicatore <i>post modifiche</i>	Motivazione adeguata
112060104	scheda 491/2018 - riqualificazione scuola Pascoli (periferie)	31/12/2018 - Determinazione a contrattare	31/12/2018 – approvazione progetto esecutivo	Ai sensi dell'art. 13 c. 1, del <u>Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91</u> , “ <u>l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato in GU n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle Delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'art.1 c. 141 Legge 11 dicembre 2016 n. 232, e' differita all'anno 2020.</u> Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione”. A fronte di quanto sopra evidenziato, l'indicatore, riferito all'obiettivo in oggetto, e' pertanto rimodulato alla data del 31/12/2018.

**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE**

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Il Dirigente  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra





RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018

Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica

Dirigente Ing. Paolo Toscano

Al Sig. Sindaco

Alla Giunta

Al Segretario Generale

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
112060104	scheda 492/2018 - lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza scuola Buonarroti	31/12/2018 - Determinazione a contrattare	31/12/2018 – approvazione progetto esecutivo	In attesa di conferma da parte della Regione Piemonte relativamente all'assegnazione del finanziamento per il "bando edilizia scolastica" al fine di provvedere alla modifica della fonte di finanziamento che attualmente risulta essere "finanziamento agevolato a valere sulle risorse fondo kjioto 3".

SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Il Dirigente

Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra

**RICHIESTA ELIMINAZIONE OBIETTIVO PEG / PDO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

Si richiede l'eliminazione del sottoindicato obiettivo in quanto intervento non finanziato

n.	Descrizione obiettivo	Motivazione adeguata
112060104	scheda 653/2018 - manutenzione impianti sportivi	Intervento non finanziato

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

**Il Dirigente**

**Ing. Paolo Toscano**

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

<b>n.</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>Indicatore <i>ante</i> modifiche</b>	<b>Indicatore <i>post</i> modifiche</b>	<b>Motivazione adeguata</b>
118110101	definizione di accordo quadro su 4 lotti per individuazione di 4 ditte referenti per intera manutenzione autoparco	31/12/2018	31/12/2018 – determinazione a contrattare	Specificato indicatore

**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL'INDICATORE POST MODIFICHE**

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

  
Il Dirigente  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

<b>n.</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>Indicatore <i>ante</i> modifiche</b>	<b>Indicatore <i>post</i> modifiche</b>	<b>Motivazione adeguata</b>
501010101	scheda 169/2018 -Palazzo civico - La porta del Monferrato	31/12/2018 – affidamento incarico di progettazione	31/12/2018 – determinazione a contrattare per affidamento incarico professionale	Disciplinare relativo al POR FESR Asse 6 è stato aggiornato con DDR 318 del 24/07/2018. Questa modifica ha comportato una rimodulazione della tempistica

**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE**

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Il Dirigente  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
501010102	Scheda 538/2018 –Palazzo Ottolenghi – restauro sale di rappresentanza	31/12/2018 – affidamento incarico di progettazione	31/12/2018 – determinazione a contrattare per affidamento incarico professionale	Disciplinare relativo al POR FESR Asse 6 è stato aggiornato con DDR 318 del 24/07/2018. Questa modifica ha comportato una rimodulazione della tempistica

**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE**

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

~~Il Dirigente~~  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra

**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

Al Sig. Sindaco

Alla Giunta

Al Segretario Generale

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
501010103	scheda 539/2018 - Palazzo Ottolenghi - restauro e ristrutturazione per attivita' di promozione del territorio - Vino e cultura	31/12/2018 – affidamento incarico di progettazione	31/12/2018 – determinazione a contrattare per affidamento incarico professionale	Disciplinare relativo al POR FESR Asse 6 è stato aggiornato con DDR 318 del 24/07/2018. Questa modifica ha comportato una rimodulazione della tempistica

**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE**

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Asti,12/10/2018

Il Dirigente  
Ing. Paolo Toscano

Visto l' Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA ELIMINAZIONE OBIETTIVO PEG / PDO 2018/2020**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

Si richiede l'eliminazione del sottoindicato obiettivo

<b>n.</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>Motivazione adeguata</b>
501010106	scheda 543/2018 – percorsi della cultura	Disciplinare relativo al POR FESR Asse 6 è stato aggiornato con DDR 318 del 24/07/2018. Questa modifica ha comportato una rimodulazione della tempistica. Rinviato – da ripresentarsi nel corso del 2019

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

  
Il Dirigente  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica

Dirigente Ing. Paolo Toscano

Al Sig. Sindaco

Alla Giunta

Al Segretario Generale

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante modifiche</i>	Indicatore <i>post modifiche</i>	Motivazione adeguata
605010101	scheda 654/2018 - riqualificazione piattaforma sportiva polifunzionale ex ferriere Ercole (periferie)	31/12/2018 – determina a contrattare	31/12/2018- approvazione progetto esecutivo	<p>Ai sensi dell'art. 13 c. 1, del <u>Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91</u>, "l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del <u>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017</u>, pubblicato in <u>GU n. 148 del 27 giugno 2017</u>, nonché delle <u>Delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017</u>, adottate ai sensi dell'art.1 c. 141 <u>Legge 11 dicembre 2016 n. 232</u>, <u>e' differita all'anno 2020</u>. <u>Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione".</u></p> <p>A fronte di quanto sopra evidenziato, l'indicatore, riferito all'obiettivo in oggetto, e' pertanto rimodulato alla data del 31/12/2018.</p>



**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE**

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Il Dirigente



Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica

Dirigente Ing. Paolo Toscano

Al Sig. Sindaco

Alla Giunta

Al Segretario Generale

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
1006050103	scheda 873/2018 - riqualificazione urbana viale Pilone (periferie)	31/12/2018 - determina a contrattare	31/12/2018 – approvazione progetto esecutivo	<p>Ai sensi dell'art. 13 c. 1, del Decreto Legge <u>25 luglio 2018 n. 91</u>, “<u>l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato in GU n. 148 del 27 giugno 2017, nonchè delle Delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'art.1 c. 141 Legge 11 dicembre 2016 n. 232, e' differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i comessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione”.</u></p> <p>A fronte di quanto sopra evidenziato, l'indicatore, riferito all'obiettivo in oggetto, e' pertanto rimodulato alla data del 31/12/2018.</p>

**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE**

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Il Dirigente

Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante modifiche</i>	Indicatore <i>post modifiche</i>	Motivazione adeguata
1006050104	scheda 872/2018 - videosorveglianza urbana controllo accessi della citta' (periferie)	31/12/2018 - determina a contrattare	31/12/2018 – approvazione progetto esecutivo	<p>Ai sensi dell'art. 13 c. 1, del <u>Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91, "l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato in GU n. 148 del 27 giugno 2017, nonchè delle Delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'art.1 c. 141 Legge 11 dicembre 2016 n. 232, e' differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione".</u></p> <p>A fronte di quanto sopra evidenziato, l'indicatore, riferito all'obiettivo in oggetto, e' pertanto rimodulato alla data del 31/12/2018.</p>

**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL'INDICATORE POST MODIFICHE**

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

  
Il Dirigente

Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVO/ PEG / PDO 2018**

**Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Dirigente Ing. Paolo Toscano**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

<b>n.</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>Indicatore ante modifiche</b>	<b>Indicatore post modifiche</b>	<b>Motivazione adeguata</b>
1221090101	scheda 1003/2018 – costruzione di nuovi loculi	conclusione fase progettuale e affidamento lavori entro il 31.12.2018 fatto salvo il finanziamento dell'opera entro giugno 2018	31/12/2018 – determinazione a contrattare	Pratica finanziata con variazione di bilancio ottobre 2018

**SI RICHIEDE INOLTRE LA MODIFICA DELL'AZIONE NEL PDO 2018 CORRISPONDENTE ALL' INDICATORE POST MODIFICHE**

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

**Il Dirigente**  
Ing. Paolo Toscano

Visto l'Assessore Ing. Stefania Morra



**RICHIESTA MODIFICA / SOSTITUZIONE OBIETTIVO/  
PERFORMANCE / PEG / Pdo 2018/2020**

**Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi**

**Dirigente Giuliana Dabbene**

**Al Sig. Sindaco**

**Alla Giunta**

**Al Segretario Generale**

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
105040201	Potenziamento del servizio recupero crediti: report di attività	Report attività al 31/12		
<b>Si richiede la modifica con il seguente nuovo obiettivo:</b>				
105040201	Potenziamento del servizio recupero crediti: relazione tecnico illustrativa del servizio di riscossione coattiva in forma diretta e sostenibilità economica		Presentazione in Giunta entro il 31/10/2018	Si è reso necessario valutare modalità alternative di riscossione coattiva che siano in grado di aumentare le performance di riscossione, di conoscere lo stato dei titoli e definire rapidamente l'eventuale inesigibilità del carico per la valutazione dei riflessi sul bilancio comunale

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
105040301	Attivazione strumenti informatici finalizzati alla gestione di banche dati incrociati: report di attività	Report attività al 31/12		
<b>Si richiede la modifica con il seguente nuovo obiettivo:</b>				
105040301	Attivazione strumenti informatici finalizzati alla gestione di banche dati incrociati: relazione tecnico illustrativa del servizio di riscossione coattiva in forma diretta e sostenibilità economica		Presentazione in Giunta entro il 31/10/2018	Si è reso necessario valutare modalità alternative di riscossione coattiva che siano in grado di aumentare le performance di riscossione, di conoscere lo stato dei titoli e definire rapidamente l'eventuale inesigibilità del carico per la valutazione dei riflessi sul bilancio comunale

Asti, 12/10/2018

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Il Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi  
Giuliana Dabbene

Visto l'Assessore al Bilancio e Personale  
Renato Berzano





**RICHIESTA MODIFICA / SOSTITUZIONE OBIETTIVO/  
PERFORMANCE / PEG / PDO 2018/2020**

Settore Corpo di Polizia Municipale e Commercio su aree Pubbliche

Dirigente Riccardo Saracco

Al Sig. Sindaco  
Alla Giunta  
Al Segretario Generale

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore <i>ante</i> modifiche	Indicatore <i>post</i> modifiche	Motivazione adeguata
316010102	Studio per innovazione mercatini di natale	entro 30/10		.....
.....	Si richiede la sostituzione / modifica con il seguente nuovo obiettivo: Gestione mercatini di natale (collocazione sperimentale via Cavour)		SI/NO	Come da indicazione del Vice Sindaco si sperimenterà direttamente la nuova formula

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato.

Asti, 12/10/2018

  
Dirigente  
Visio Il Vice Sindaco

**RICHIESTA MODIFICA OBIETTIVI PERFORMANCE / PEG / PdO 2018/2020.**

Settore Politiche Sociali, Istruzione e servizi educativi  
Dirigente Dott. Gianluigi Porro

Al Sig. Sindaco  
Alla Giunta  
Al Segretario Generale

n.	Descrizione obiettivo	Indicatore ante modifiche	Indicatore post modifiche	Motivazione adeguata
1203020102	Realizzazione di uno studio di fattibilità, da effettuare di concerto con SETTORE URBANISTICA e ATC, sulla possibilità di trasformazione dei piani terra di edifici di proprietà ATC, attualmente a destinazione commerciale, al fine di creare nuove unità abitative da destinare a disabili e/o anziani	Studio di fattibilità entro 31.12.2018	Avvio studio di fattibilità entro 31.12.2018	Trattandosi di obiettivo intersettoriale che coinvolge anche un Ente esterno (ATC) non si presume di terminare l'attività entro l'anno in corso.
1218040101	Realizzazione studio di fattibilità da realizzare di concerto con il SERVIZIO TRIBUTI e il SETTORE LAVORI PUBBLICI sulle possibilità di applicazione della normativa vigente in materia	Studio di fattibilità entro 31.12.2018	Avvio studio di fattibilità entro 31.12.2018	Trattandosi di obiettivo intersettoriale non si presume di terminare l'attività entro l'anno in corso.
1206030101	Avvio degli adempimenti necessari alla sottoscrizione di una Convenzione con la Provincia per implementare la partecipazione degli anziani alle iniziative promosse da quest'ultima (soggiorni e gite)	Realizzazione degli adempimenti finalizzati alla sottoscrizione di una Convenzione con la Provincia per consentire la partecipazione degli anziani alle attività programmate per il 2019	Verifica di fattibilità rispetto alla sottoscrizione di una Convenzione con la Provincia per consentire la partecipazione degli anziani alle attività programmate per il 2019.	Trattandosi di obiettivo che coinvolge anche un Ente esterno non si presume di concludere l'attività entro l'anno in corso

Si propone l'accoglimento di quanto sopra indicato

Asti, 11.10.2018

Il Dirigente  
Gianluigi Porro

Visto l'Assessore Ai Servizi sociali, Volontariato, Sanità

Mariangela Cotta  
*Mariangela Cotta*
