



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**CITTA'
DI
ASTI**

P.N.R.R. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE

30 GIUGNO 2025

INDICE

1.	Next Generation EU	1
2.	Il Piano italiano	3
3.	I bandi segnalati	5
4.	Interventi finanziati	11
5.	Interventi non ammessi a finanziamento	24
6.	Totale ammesso a finanziamento	25
7.	Interventi in attesa di esito	28
8.	Interventi a cui si è rinunciato	28
9.	Fondo Opere Indifferibili (F.O.I.)	28
10.	D.L. 19/2024 come convertito in L. 56/2024	33
11.	Piccole Opere	33
12.	Medie Opere	37
13.	Interventi di Rigenerazione Urbana	40
14.	Sport e Inclusione sociale	41
15.	Quadro di riepilogo somme finanziate e successive modifiche	42
16.	Quadro di riepilogo delle somme attualmente in gestione	51
16.1	Quadro di riepilogo somme attualmente in gestione suddivise per missioni	52
16.2	Quadro di riepilogo somme attualmente in gestione suddivise per settori	53
17.	Stato di attuazione degli interventi attualmente in gestione	54
-	Stato di attuazione degli interventi finanziati Missione 1.....	54
-	Stato di attuazione degli interventi finanziati Missione 2.....	57
-	Stato di attuazione degli interventi finanziati Missione 4.....	58
-	Stato di attuazione degli interventi finanziati Missione 5.....	59
-	Stato di attuazione degli interventi finanziati Fondo complementare e supporto	62
-	Strumenti e iniziative a supporto dell'attuazione del PNRR	62
18.	Tabelle stato di attuazione degli interventi finanziati Missione 1	63
19.	Tabelle stato di attuazione degli interventi finanziati Missione 2	64
20.	Tabelle stato di attuazione degli interventi finanziati Missione 4	65
21.	Tabelle stato di attuazione degli interventi finanziati Missione 5	66
22.	Tabelle stato di attuazione degli interventi finanziati Fondo Complementare e supporto	66
23.	Tabella stato di attuazione del totale degli interventi finanziati	67
24.	Linee guida della comunicazione	68

1. NEXT GENERATION EU

La **pandemia di Covid-19** è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di adattare l'attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

Nel **dicembre 2019**, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato lo **European Green Deal** che intende rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.

La pandemia, e la conseguente crisi economica, hanno spinto l'UE a formulare una risposta coordinata a livello

sia congiunturale, con la sospensione del Patto di Stabilità e ingenti pacchetti di sostegno all'economia adottati dai singoli Stati membri,

sia strutturale, in particolare con il lancio a luglio 2020 del programma Next Generation EU (NGEU).

Il NGEU segna un cambiamento epocale per l'UE. La quantità di risorse messe in campo per rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme ammonta a **750 miliardi di euro**, dei quali oltre la metà, 390 miliardi, è costituita da sovvenzioni. Le risorse destinate al Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), la componente più rilevante del programma, sono reperite attraverso l'emissione di titoli obbligazionari dell'UE, facendo leva sull'innalzamento del tetto alle Risorse Proprie. Queste emissioni si uniscono a quelle già in corso da settembre 2020 per finanziare il programma di "sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza" (*Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency - SURE*).

L'iniziativa NGEU canalizza notevoli risorse verso Paesi quali **l'Italia** che, pur caratterizzati da livelli di reddito *pro capite* in linea con la media UE, hanno recentemente sofferto di **bassa crescita economica ed elevata disoccupazione**. Il meccanismo di allocazione tra Stati Membri riflette infatti non solo variabili strutturali come la popolazione, ma anche variabili contingenti come la perdita di prodotto interno lordo legato alla pandemia. I fondi del NGEU possono permettere al nostro Paese di rilanciare gli investimenti e far crescere l'occupazione, anche per riprendere il processo di convergenza verso i Paesi più ricchi dell'UE.

Il **programma NGEU** comprende **due strumenti** di sostegno agli Stati membri.

- Il **REACT-EU** è stato concepito in un'ottica di più breve termine (2021-2022) per aiutarli nella fase iniziale di rilancio delle loro economie.
- Il **RRF** ha invece una durata di sei anni, dal 2021 al 2026. La sua dimensione totale è pari a 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi sono sovvenzioni e 360 miliardi prestiti a tassi agevolati.

Il NGEU intende promuovere una robusta ripresa dell'economia europea all'insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere. Il Regolamento RRF enuncia le sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i PNRR si dovranno focalizzare:

Transizione verde

Discende direttamente dallo **European Green Deal** e dal doppio obiettivo dell'Ue di raggiungere la **neutralità climatica** entro il 2050 e **ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento** rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030. Il regolamento del NGEU prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e riforme programmata nei PNRR debba sostenere gli obiettivi climatici. Inoltre, tutti gli investimenti e le riforme previste da tali piani devono rispettare il principio del "non arrecare danni significativi" all'ambiente.

Gli Stati membri devono illustrare come i loro Piani contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici, ambientali ed energetici adottati dall'Unione. Devono anche specificare l'impatto delle riforme e degli investimenti sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la quota di energia ottenuta da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, l'integrazione del sistema energetico, le nuove tecnologie energetiche pulite e l'interconnessione elettrica.

Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Venendo alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Piani devono rispondere alle conseguenze economiche e sociali della crisi pandemica attraverso strategie economiche che portino ad una ripresa rapida, solida e inclusiva e che migliorino la crescita potenziale. Devono pertanto contribuire a migliorare la produttività, la competitività e la stabilità macroeconomica, in linea con le priorità delineate nella Strategia annuale per la crescita sostenibile⁵. I piani devono contribuire all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali in relazione alle sue dimensioni di pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; accesso all'assistenza sanitaria; protezione e inclusione sociale. I piani devono promuovere un cambiamento nelle politiche del lavoro, anche al fine di facilitare e accelerare cambiamenti strutturali quali le transizioni verdi e digitali.

Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale

Per quanto riguarda salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, gli Stati membri devono rafforzare la propria capacità di risposta a shock economici, sociali e ambientali e a cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo. La pandemia ha evidenziato la vulnerabilità dei sistemi sanitari di fronte a tassi di contagio elevati e altre debolezze strutturali. La crisi economica ha ridotto la capacità degli Stati membri di crescere, e ha esacerbato gli squilibri e le disparità territoriali. Si deve pertanto puntare a rafforzare le catene di approvvigionamento e le infrastrutture industriali e sanitarie. È infine necessario salvaguardare le catene del valore e le infrastrutture critiche, nonché garantire l'accesso alle materie prime di importanza strategica e proteggere i sistemi di comunicazione

Trasformazione digitale

I Piani devono dedicarvi almeno il 20 per cento della spesa complessiva per investimenti e riforme. L'obiettivo è migliorare le prestazioni digitali sintetizzate dall'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI)² e dagli obiettivi delineati nella Comunicazione della Commissione "Progettare il futuro digitale dell'Europa".

Il pilastro digitale dei PNRR deve comprendere la razionalizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione e lo sviluppo dei servizi pubblici digitali. Si deve inoltre migliorare la connettività, anche tramite un'ampia diffusione di reti di telecomunicazione (TLC) ad altissima capacità. I costi per gli utenti devono essere sostenibili e la velocità di realizzazione della rete deve essere aumentata. I Piani devono inoltre sostenere la ricerca e sviluppo (R&S) nelle TLC e l'adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, in particolare delle piccole e medie. Le competenze digitali di cittadini e lavoratori devono aumentare, così come la loro capacità di accesso a strumenti e servizi digitali, particolarmente per i gruppi sociali vulnerabili. Gli investimenti digitali devono essere allineati alle comunicazioni della Commissione in materia⁴. Devono essere evidenziate e valorizzate le sinergie tra investimenti verdi e digitali.

Coesione sociale e territoriale

Il quarto pilastro è la coesione sociale e territoriale. I Piani rafforzano la coesione e riducono le disparità locali, regionali e fra centri urbani e aree rurali. Devono anche affrontare sfide generali come quelle legate alle disuguaglianze di genere e di reddito e alle tendenze demografiche. Gli Stati membri devono descrivere le tendenze e

i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, anche in conseguenza dell'epidemia da COVID- 19, e spiegare come i rispettivi Piani allevino la crisi e promuovano la coesione e la risoluzione degli squilibri territoriali in linea con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani

Venendo infine alle politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani, i Piani nazionali devono migliorare i sistemi educativi e di cura della prima infanzia, nonché le competenze di tutta la popolazione, comprese quelle digitali. Le nuove generazioni di europei non devono subire danni permanenti dalla crisi COVID-19. In linea con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali, gli Stati membri devono puntare a colmare i divari generazionali e rafforzare le politiche attive del lavoro e l'integrazione dei disoccupati. Risorse aggiuntive devono essere investite nel miglioramento dell'accesso e delle opportunità per bambini e giovani e all'istruzione, alla salute, all'alimentazione e agli alloggi.

2. IL PIANO ITALIANO

Il **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR) è il documento strategico che definisce il programma di investimenti e di riforme che il governo italiano ha predisposto per fronteggiare la crisi prodotta dalla pandemia Covid19 e rimettere il Paese su un piano di crescita sostenibile e inclusiva, utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Iniziativa europea **Next Generation Eu** (NGEU).

Il Piano si articola in **6 Missioni**, ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del NGEU.

Le Missioni si articolano in **16 Componenti**, aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da **Investimenti e Riforme**.

Per il PNRR Italia l'Unione europea ha stanziato **191,5 mld di euro** in sovvenzioni e prestiti del *Recovery and Resilience Facility* (RRF), il fondo dedicato a contrastare gli effetti della pandemia. L'Italia ha integrato l'importo con ulteriori **30,6 mld di euro** attraverso il **Piano Complementare**, finanziato direttamente dallo Stato, che ha portato il totale a **222,1 mld di euro**.

Tutti gli interventi previsti saranno realizzati **entro il 2026**.

Il Governo ha predisposto uno schema di *governance* del Piano che prevede una struttura di coordinamento centrale presso il Ministero dell'economia. Questa struttura supervisiona l'attuazione del Piano ed è responsabile dell'invio delle richieste di pagamento alla Commissione europea, invio che è subordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti. Accanto a questa struttura di coordinamento, agiscono strutture di valutazione e di controllo. Le amministrazioni sono invece responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme e inviano i loro rendiconti alla struttura di coordinamento centrale.

MISSIONE	COMPONENTE	PNRR	FONDO COMPL	TOT	REACT EU
M1-DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO	C1-DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA P.A.	9,75	1,20	10,95	00,00
	C2- DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	24,30	5,88	30,18	0,80
	C3- TURISMO E CULTURA 4.0	6,68	1,46	8,13	0,00
	Totale Missione 1	40,73	8,54	49,27	0,80
M2-RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C1-AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE	5,27	1,20	6,47	0,50
	C2-TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE	23,78	1,40	25,18	0,18
	C3-EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	15,22	6,72	21,94	0,32
	C4-TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	15,06	0,00	15,06	0,31
	Totale Missione 2	59,33	9,32	68,65	1,31
3.INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	C1-RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ	24,77	3,53	28,30	0,00
	C2-INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA	0,36	2,80	3,16	0,00
	Totale Missione 3	25,13	6,33	31,46	0,00
4.ISTRUZIONE E RICERCA	C1-POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	19,44	0,00	19,44	1,45
	C2-DALLA RICERCA ALL'IMPRESA	11,44	1,00	12,44	0,48
	Totale Missione 4	30,88	1,00	31,88	1,93
5.INCLUSIONE E COESIONE	C1-POLITICHE PER IL LAVORO	6,66	0,00	6,66	5,97
	C2-INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	11,17	0,13	11,30	1,28
	C3-INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE	1,98	2,43	4,41	0,00
	Totale Missione 5	19,81	2,56	22,37	7,25
6.SALUTE	C1-RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	7,00	0,50	7,50	1,50
	C2-INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,63	2,39	11,01	0,21
	Totale Missione 6	15,63	2,89	18,51	1,71
	TOTALE	191,5	30,6	222,1	13,0

3. I BANDI SEGNALATI

I bandi segnalati dal servizio Ricerca Finanziamenti ai diversi Settori comunali sono stati i seguenti:

M1-DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

	ENTE FINANZIATORE	TITOLO DEL BANDO	SETTORE INFORMATO
M1 . 1	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO Scadenza:02-9-2022	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
M1.2	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA Scadenza: 02-09-2022	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
M1 .3	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE – SPID CIE” Scadenza: 02-09-2022	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
M1 .4	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” Scadenza: 25-05-2022	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
M1 .5	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” Scadenza: 22-07-2022	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
M1 .6	MINISTERO DELLA CULTURA	MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 – “MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI” Scadenza: 18-03-2022	CULTURA, MANIFESTAZIONIE, RICERCA FINANZIAMENTI – LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
M1 .7	MIC	PNRR . MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER PERMETTERE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA Scadenza 12-08-2022	Cultura, manifestazioni, ricerca finanziamenti
M1.8	MIC	PNRR . MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI	Cultura, manifestazioni, ricerca finanziamenti e LLPP

		Scadenza 15-03-2022	
M1.9	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	PNRR – MISSIONE 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – COMUNI	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE
M1.10	MINISTERO PER L’INNOVAZIONE A LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	PNRR – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA’ – MISURA 1.3.1	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE
M1.11	REGIONE PIEMONTE – DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE	PNRR – MISSIONE 1.1.7 “RETI DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE”	SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI
M1.12	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	PNRR – MISURA 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE) - COMUNI	SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
M1.13	DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	PNRR – MISURA 1.4.4 – ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO, TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI
M1.14	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	PNRR – MISURA 1.4.3 – AVVISO ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE
M1.15	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	PNRR – AVVISO RIVOLTO AI COMUNI AL FINE DI CONSENTIRE AGLI STESSI ENTI DI ADOTTARE I SERVIZI DELL’AppIO. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 DEL PNRR, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE App IO”, FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU.	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE
M1.16	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	PNRR – MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE)" – ENTI TERZI - COMUNI	SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
M1.17	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	PNRR – MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" ANNC SU – COMUNE –MAGGIO 2025	SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO, TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI

M2-RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA			
M2 .1	MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	PNRR – Missione 2, Componente 1 – Investimento 1.1 Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani Scadenza: 16-03-2022	Settore PATRIMONIO, AMBIENTE e RETI per inoltro a EGATO Operativo
M2 .2	MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	PNRR – Missione 2, Componente 1 – Investimento 1.1 Linea B- Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata Scadenza: 16-03-2022	Settore PATRIMONIO, AMBIENTE e RETI per inoltro a EGATO Operativo
M2 .3	MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	PNRR – Missione 2, Componente 1 – Investimento 1.1 Linea C – Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili. Scadenza: 16-03-2022	Settore PATRIMONIO, AMBIENTE e RETI per inoltro a EGATO Operativo
M2.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PNRR - Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici Scadenza: 8 febbraio 2022	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
M2.5	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	MISSIONE 2 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 4.4.1 FONDI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI AUTOBUS AD EMISSIONI ZERO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA O AD IDROGENO E ALLA REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALL'ALIMENTAZIONE, PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. Scadenza:21-02-2022	PATRIMONIO, AMBIENTI E RETI
M2.6	MINISTERO DELL'INTERNO Non ha una scadenza di presentazione del progetto ma di realizzazione dell'intervento con i soldi stanziati	MISSIONE 2 COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – D.M. 30-1-2020 E D.M. 11-11-2020 – INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024.	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

M2.7	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Non ha una scadenza di presentazione del progetto ma di realizzazione dell'intervento con i soldi stanziati	MISSIONE 2 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 4.1 – REALIZZAZIONE CICLOVIE – D.M. 12-8-2020	PATRIMONIO AMBIENTE E RETI E LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
M2.7	Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	MISSIONE 2 – COMPONENTE 1 "Agricoltura sostenibile e agricoltura circolare" – INVESTIMENTO 2.1 – "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e transizione ecologica"	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

M4.ISTRUZIONE E RICERCA			
M4.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU Scadenza: 28-02-2022	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
M4.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU Scadenza: 28-02-2022	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
M4.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Scadenza: 28-02-2022	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
M4.4	REGIONE PIEMONTE	MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ALL'INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018-2020 MEDIANTE LO SCORRIMENTO DEL PIANO ANNUALE 2020 E L'AGGIORNAMENTO DEI PROGETTI. Scadenza: 21-01-2022	LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA PUBBLICA

M5. INCLUSIONE E COESIONE			
M5.1	MINISTERO DELL'INTERNO	MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE – PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA Scadenza:04-06-2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
M5.2	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1: SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Scadenza: 31-03-2022	POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI
M5.3	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1: SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 1 E 2 Scadenza:22-04-2022	Lavori pubblici ed edilizia pubblica
M5.4	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1: SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 3 Scadenza:22-04-2022	Lavori pubblici ed edilizia pubblica
M5.5	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	PNRR- MISSIONE 2 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE – PINQUA Scadenza: 18-03-2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA, POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI, URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
M5.6	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – AVVISO PUBBLICO 1/2022 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR	POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI

FONDO COMPLEMENTARE			
FC 1	REGIONE PIEMONTE	PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: “RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” Scadenza: 31-12-2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA, POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI,

STRUMENTI E INIZIATIVE A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PNRR			
StrS 1	COMPAGNIA DI SAN PAOLO	NEXT GENERATION WE Scadenza: 31-01-2022	INTERSETTORIALE
StrS 2	COMPAGNIA DI SAN PAOLO	Next Generation Schools Scadenza: 31-03-2022	POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI
StrS 3	COMPAGNIA DI SAN PAOLO	NEXT GENERATION WE – SECONDA EDIZIONE Scadenza: 31-12-2022	INTERSETTORIALE

4. INTERVENTI FINANZIATI


M1-DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO							
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
M1.1 ADOZIONE APP IO	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO	G31F22001100006	32.760,00	32.760,00
M1.2 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	G31F22004220006	80.124,00	80.124,00
M1.3 ADOZIONE SP SPID CIE	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	AVVISO 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE – SPID CIE"	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE – SPID CIE"	G31F23000360006	14.000,00	14.000,00
M 1.4 ADOZIONE "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	AVVISO 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	G31F22003010006	59.966,00	59.966,00
M1.5 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI – COMUNI	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	AVVISO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	G31C23000020006	352.652,00	352.652,00

M1.6 a) PROMOZIONE DELLA ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEI CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO SPAZIO KOR	MIC	Proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati	CULTURA, MANIFESTAZIONI, ISTITUTI CULTURALI, RICERCA FINANZIAMENTI	MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 – “MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI”	G34H22000150001	312.423,87	250.000,00
M1.6 b) PROMOZIONE DELLA ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEI CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO ALFIERI	MIC	Proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati	CULTURA, MANIFESTAZIONI, ISTITUTI CULTURALI, RICERCA FINANZIAMENTI	MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 – “MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI”	G34H22000130001	619.076,57	400.000,00
M 1.9 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI”	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI (APRILE 2022)”	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	M1C1 PNRR Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” parte della Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”	G31F22003670006	328.160,00	328.160,00
M 1.10 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE – DATI – COMUNI	MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	Avviso Pubblico “Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati – COMUNI (OTTOBRE 2022)” PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	Missione 1 Componente 1 Investimento 1.3. “Dati e interoperabilità”, parte della Misura 1.3.1. “Piattaforma Nazionale Digitale Dati”.	G51F22004800006	162.748,00	162.748,00
M 1.11 RETI DI FACILITAZIONE AL DIGITALE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO FACILITAZIONE AL DIGITALE – SOGGETTO ATTUATORE: REGIONE PIEMONTE	Bando regionale non competitivo rivolto alle Città capoluogo di provincia, agli Enti gestori socioassistenziali, alle Strategie urbane d'area, alle Aree interne, alle Green communities ed alle ulteriori aggregazioni spontanee di comuni (soggetti sub attuatori) per l'attuazione della Misura 1.7.2. del P.N.R.R..	SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	Missione 1 Componente 1 Investimento 1.1.7” Reti di facilitazione al digitale”391230014900 06	G39123001490006	152.915,84	152.915,84

M1.12 – DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO FACILITAZIONE AL DIGITALE		SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	P.N.R.R. MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE”	G31F24000240006	62.698,96	62.698,96
M1.13 – ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 8ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO FACILITAZIONE AL DIGITALE	AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”	SETTORE RAGIONERIAIA, BILANCIO, TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI	P.N.R.R. MISSIONE 1 – MISURA C1.4.4 – ESTENSIONE DELL’UTILIZZO FRLL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	G51F24003630006	16.274,80	16.274,80
M1.16 – DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP – ENTI TERZI - COMUNI	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO FACILITAZIONE AL DIGITALE –	AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI PER L’ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITA’ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP), PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A VALRE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE	P.N.R.R. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” – ENTI TERZI - COMUNI	G31F25000430006	27.452,56	27.452,56
TOTALE M1						2.221.252,60	1.939.752,16

SETTORE	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONIE, RICERCA FINANZIAMENTI – LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	931.500,44	650.000,00
SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE	1.030.410,00	1.030.410,00
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	152.915,84	152.915,84
SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE	90.151,52	90.151,52

SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO, TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI	16.274,80	16.274,80
TOTALE	2.221.252,60	1.939.752,16

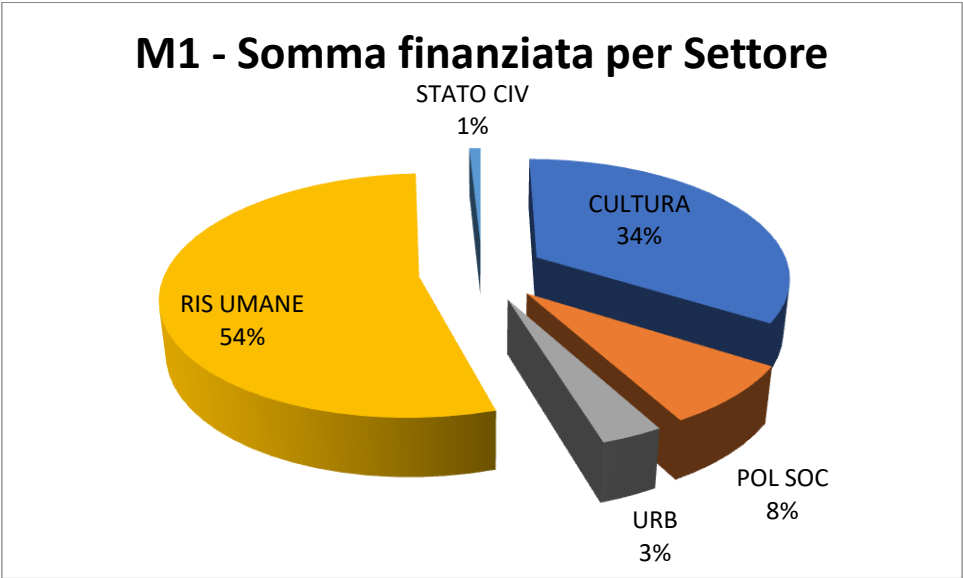

2-RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA							
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
M2.5 a) RINNOVO AUTOBUS A COMBUSTIBILI PULITI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n° 530 del 23/12/2021 Riparto delle risorse del PNRR	APPALTI E CONTRATTI	M 2 – C2 – INV 4.4.1 FONDI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI AUTOBUS AD EMISSIONI ZERO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA O AD IDROGENO	G30J220000000001	6.909.928,00	6.909.928,00
M2.5 b) RINNOVO AUTOBUS A COMBUSTIBILI PULITI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n° 530 del 23/12/2021 Riparto delle risorse del PNRR	APPALTI E CONTRATTI	M 2 – C2 – INV 4.4.1 FONDI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI AUTOBUS AD EMISSIONI ZERO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA O AD IDROGENO	I30J210000000008	5.400.000,00	5.400.000,00
M2.6 a) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CAGNI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E CALDAIA	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex articolo 1 comma 29 e seguenti della Legge 160/2019 ANNO 2020	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2- C4 –I2.2 - PICCOLE OPERE	G39E20000270001	170.000,00	170.000,00
M2.6 b) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA SAN DOMENICO SAVIO , VIA TOSI N. 24, - SOSTITUZIONE SERRAMENTI	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex articolo 1 comma 29 e seguenti della Legge 160/2019 ANNO 2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2- C4 –I2.2 - PICCOLE OPERE	G31D21000230001	170.000,00	170.000,00
M2.6 c) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CAVOUR , VIA COMENTINA, 10, - SOSTITUZIONE SERRAMENTI	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex articolo 1 comma 29 e seguenti della Legge 160/2019 ANNO 2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2- C4 –I2.2 - PICCOLE OPERE	G31D21000220001	170.000,00	170.000,00


M2.6 d) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI- SCUOLA PRIMARIA F. BARACCA SOSTITUZIONE SERRAMENTI	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex articolo 1 comma 29 e seguenti della Legge 160/2019 ANNO 2022	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2- C4 –I2.2 - PICCOLE OPERE	G34D22000000001	170.000,00	170.000,00
M2.6 e) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – FONDI ANNO 2023	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex articolo 1 comma 29 e seguenti della Legge 160/2019 – ANNO 2022	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2- C4 –I2.2 - PICCOLE OPERE	G34D22004250006	170.000,00	170.000,00
M2.6 f) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – FONDI ANNO 2024	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex articolo 1 comma 29 e seguenti della Legge 160/2019 – ANNO 2024	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2- C4 –I2.2 - PICCOLE OPERE	G34D22004250006	170.000,00	170.000,00
M2.8 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CAVALCAVIA/CAVALC AFERROVIA GIOLITTI - SCHEDA 158/2020	MINISTERO DELL'INTERNO	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2 – C4 . INVESTIMENTO 2.2 – MEDIE OPERE	G37H20001160001	994.000,00	994.000,00

M2.9 INTERVENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSARELLA PEDONALE IN CORSO SAVONA PARALLELA AL PONTE FERROVIARIO SULLA LINEA TO-GE - SCHEDA 887/2020	MINISTERO DELL'INTERNO	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2 – C4 . INVESTIMENTO 2.2 – MEDIE OPERE	G31B200 0060000 1	995.000,00	995.000,00
M2.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE VIARIE IN ZONA URBANA - SCHEDA 888/2020 -	MINISTERO DELL'INTERNO	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2 – C4 . INVESTIMENTO 2.2 – MEDIE OPERE	G37H200 0117000 1	169.000,00	169.000,00
M2.11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE VIARIE IN ZONA EXTRAURBANA - SCHEDA 889/2020 -	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2 – C4 . INVESTIMENTO 2.2 – MEDIE OPERE	G37H200 0118000 1	986.000,00	986.000,00
M2.12 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE DELL'INFANZIA - SCHEDA 424/2020 -	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2 – C4 . INVESTIMENTO 2.2 – MEDIE OPERE	G34H200 0064000 1	350.000,00	350.000,00

M2.13 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE PRIMARIE SCHEDA 425/2020 -	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2 – C4 . INVESTIMENTO 2.2 – MEDIE OPERE	G34H200 0065000 1	450.000,00	450.000,00
M2.14 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - SCHEDA 426/2020 -	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2 – C4 . INVESTIMENTO 2.2 – MEDIE OPERE	G37H200 0116000 1	350.000,00	350.000,00
TOTALE						17.623.928,00	17.623.928,00

M2-RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA		
SETTORE	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	5.314.000,00	5.314.000,00
APPALTI E CONTRATTI	12.309.928,00	12.309.928,00
TOTALE	17.623.928,00	17.623.928,00

M 2 - Somma Finanziata per Settori

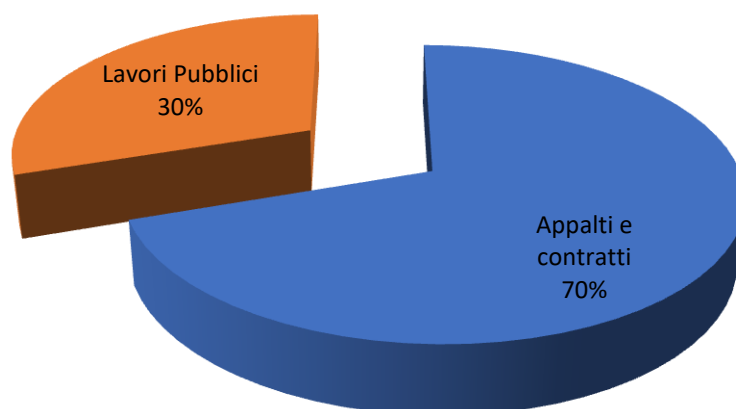

M4. ISTRUZIONE E RICERCA							
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
M4.1 AMPLIAMENTO MENZA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK"	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense"	G34E22000150006	560.000,00	560.000,00
M4.3 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI RELATIVAMENTE ALL'ASILO NIDO "LO SCOIATTOLO"	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	G38I22000260006	1.010.000,00	1.010.000,00
M4.4 SCUOLA RIO CROSIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Decreto Ministero Istruzione e del Merito 7-12-2022 N. 320	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"	G31F19000170001	8.256.800,00	7.882.228,00

						9.826.800,00	9.452.228,00
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------


SETTORE	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	9.826.800,00	9.452.228,00

M5. INCLUSIONE E COESIONE							
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
M5.1 a) SCUOLA D'INFANZIA SANTA CATERINA	MINISTERO DELL'INTERNO	RIGENERAZIONE URBANA 2021 – MIN. INTERNO - DECRETO 21/01/2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE – PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA Scadenza:04-06-2021	G31F20000000001	1.424.000,00	1.329.740,84
M5.1 b) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PROBLEMI VETUSTA' ALLOGGI ERP	MINISTERO DELL'INTERNO				G39J21006290001	733.900,00	733.900,00
M5.1 c) SCUOLA EX MARTIRI DELLA LIBERTA	MINISTERO DELL'INTERNO				G31F20000010001	6.824.000,00	6.496.345,00
M5.1 d) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA PRIMARIA LAIOLO - FRAZIONE SAN CARLO	MINISTERO DELL'INTERNO				G38I21000600001	1.440.000,00	1.440.000,00
M 5.2 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	M5C2 – Investimento 1.1 Linea di sub-investimento 1.1.3	G34H22000370007	330.000,00	330.000,00
M5.3 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN LOC. FONTANINO	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Avviso pubblico di invito a manifestare interesse PNRR, missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale"	Lavori pubblici ed edilizia pubblica	MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVEST 3.1: SPORT E INCLUS SOCIALE – CLUSTER 1 E 2	G35B22000270006	1.500.000,00	1.500.000,00
M5.4 RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA GERBI			Lavori pubblici ed edilizia pubblica		G33I22000060006	1.000.000,00	1.000.000,00

M 5.6 a)1 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI	PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea	G34H22000390007	715.000,00	715.000,00
M 5.6 a)2 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro					G34H22000800007	238.333,32	238.333,32
M 5.6 b)3 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali					G34H22000380007	210.000,00	210.000,00
M 5.6 c) Povertà estrema – Stazioni di posta	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub-investimento 1.3.2	G34H2200 0410007	750.000,00	750.000,00
M 5.6 d) Housing first				M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub-investimento 1.3.1	G34H22000400007	710.000,00	710.000,00
M5.11	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DM 74 28-06-2019 PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M5 C1 investimenti 1.1 – Potenziamento dei centri per l'impiego	G39C22000040002	3.000.000,00	3.000.000,00
						18.875.233,32	18.453.319,16

SETTORE	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	15.921.900,00	15.499.985,00
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	2.953.333,32	2.953.333,32
TOTALE	18.875.233,32	18.453.319,16

M5 - Somma Finanziata per Settori

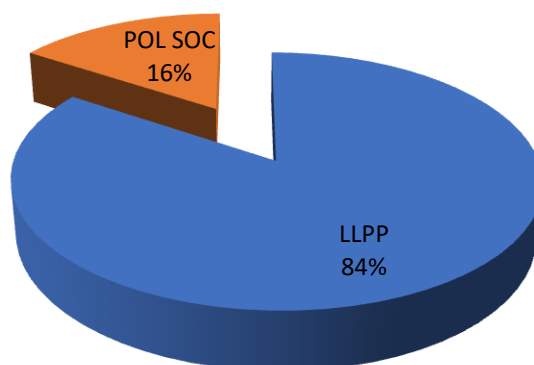

FONDO COMPLEMENTARE							
OGGETTO	ENTE	BANDO/DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
FC 1 Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica – via Catalani	REGIONE PIEMONTE	Regione Piemonte – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica”.	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA, POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI,	PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: “RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”	G38I21004210001	900.000,00	900.000,00
						900.000,00	900.000,00

SETTORE	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	900.000,00	900.000,00

STRUMENTI E INIZIATIVE A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PNRR							
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
Str 1 Progetto #ECOTEATRIASTI	COMPAGNIA DI SAN PAOLO	NEXT GENERATION WE	CULTURA, MANIFESTAZIONE, ISTITUTI CULTURALI, RICERCA FINANZIAMENTI			80.000	80.000
						80.000	80.000

SETTORE	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONE, ISTITUTI CULTURALI, RICERCA FINANZIAMENTI	80.000,00	80.000,00

5. INTERVENTI NON AMMESSI A FINANZIAMENTO

M1-DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO							
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/ DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
M1.7	REGIONE PIEMONTE		SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONE, ISTITUTI CULTURALE, RICERCA FINANZIAMENTI	MISSIONE 1 – COMPONENTE 3- INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER PERMETTERE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"	NON ANCORA ACQUISITO	NON DEFINITO	NON DEFINITO

M4. ISTRUZIONE E RICERCA							
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/ DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
M 4.1 RIQUALIFICAZIONE MENSA SCUOLA OBERDAN	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Avviso pubblico n. 48038 del 2 dicembre 2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'" – INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE"	G33D22000760006	55.000,00	55.000,00
M 4.2 REALIZZAZIONE PIATTAFORMA SPORTIVA SCUOLA PRIMARIA "GRAMSCI	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'" – INVESTIMENTO 1.3: "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE".	G31B22001300006	56.250,00	56.250,00
M 4.2 REALIZZAZIONE PIATTAFORMA SPORTIVA SCUOLA PRIMARIA "SALVO D'ACQUISTO"	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	– Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole".	G31B22001310006	22.500,00	22.500,00

M 4.4 EDILIZIA SCOLASTICA	REGIONE PIEMONTE	DD 6/A1511C/202 2 DEL 10-01- 2022	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ALL'INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018-2020 MEDIANTE LO SCORRIMENTO DEL PIANO ANNUALE 2020 E L'AGGIORNAMENTO DEI PROGETTI	SONO VARI	NON PERVENUTI	NON PERVENUTI
------------------------------	------------------	--	---	--	-----------	---------------	---------------


M5. INCLUSIONE E COESIONE							
OGGETTO	ENTE FINANZIATO RE	BANDO/ DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
M 5. 6 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR	SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	M5C2 – Investimento 1.1 Linea di sub- investimento 1.1.1	G34H22000350007	211.500,00	211.500,00
M5.2 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZ ZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - LINEA 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR	SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	M5C2 – Investimento 1.1 Linea di sub- investimento 1.1.2	G34H22000360007	2.400.000,00	2.400.000,00
M5.6 POVERTA' ESTREMA – HOUSING FIRST	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR	SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub- investimento 1.3.1	G34H22000400007	710.000,00	710.000,00
M 5.5 PINQUA - PROGRAMMA INNOVATIVO	MINISTERO DELLE INFRASTRUT	DECRETO INTERMINISTERIALE	SETTORE LAVORI PUBBLICI ED	MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE	DIVERSI	10.117.821,83	10.117.821,83

NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE	TURE E DEI TRASPORTI	329 DEL 16-9-2020	EDICZLIA PUBBLICA	COMPONETE 2 – INVESTIMENTO 2.3	DIVERSI	16.194.523,54	13.526.923,54
--	----------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------	---------	---------------	---------------


6. TOTALE AMMESSO A FINANZIAMENTO

MISSIONE 1	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONIE, RICERCA FINANZIAMENTI	931.500,44	650.000,00
SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	1.030.410,00	1.030.410,00
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI	152.915,84	152.915,84
SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	90.151,52	90.151,52
SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO, TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI	16.274,80	16.274,80
TOTALE	2.221.252,60	1.939.752,16
MISSIONE 2	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	5.314.000,00	5.314.000,00
SETTORE APPALTI E CONTRATTI	12.309.928,00	12.309.928,00
TOTALE	17.623.928,00	17.623.928,00
MISSIONE 4	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	9.826.800,00	9.452.228,00
MISSIONE 5	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	15.921.900,00	15.499.985,84
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	2.953.333,32	2.953.333,32
TOTALE	18.875.233,32	18.453.319,16
FONDO COMPLEMENTARE	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	900.000,00	900.000,00
SUPPORTO	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
SETTORE CULTURA, MANISTEFAZIONE, ISTITUTI CULTURALI, RICERCAFINANZIAMENTI	80.000,00	80.000,00
TOTALE	49.527.213,92	48.449.227,32

Totale finanziato per Settori

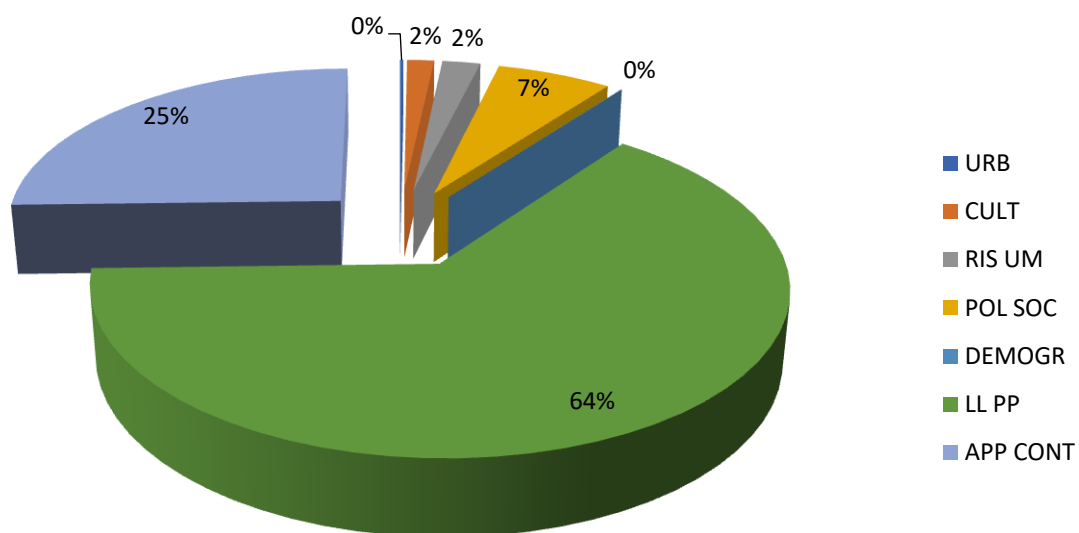

Totale finanziato per Missioni

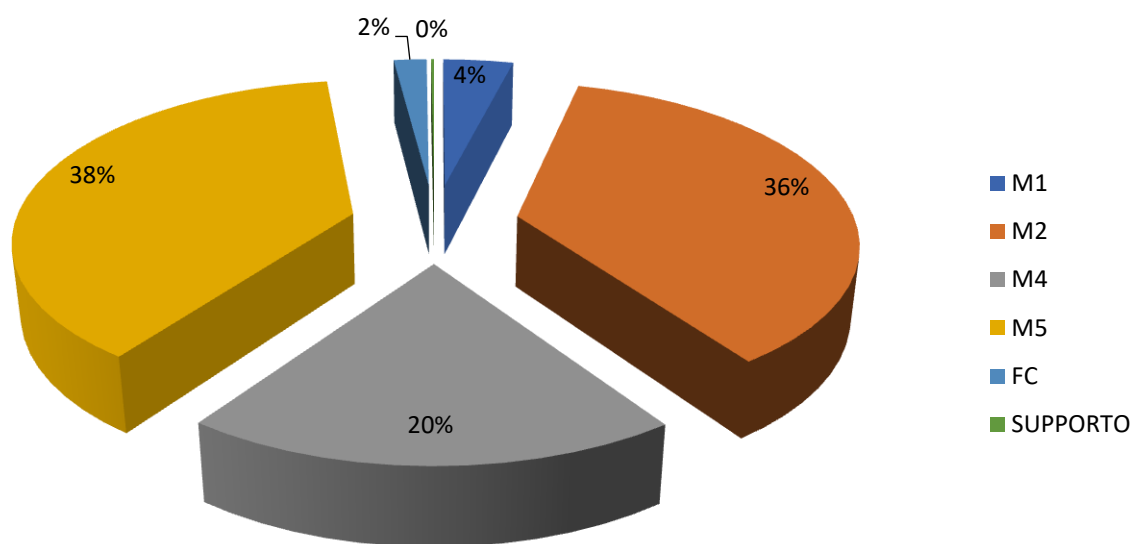

7. INTERVENTI IN ATTESA DI ESITO

Nessuno

8. INTERVENTI A CUI SI E' RINUNCIATO

M5. INCLUSIONE E COESIONE							
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/ DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
M5.1 SCUOLA D'INFANZIA SANTA CATERINA	MINISTERO DELL'INTERNO	RIGENERAZIONE URBANA 2021 – MIN. INTERNO - DECRETO 21/01/2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE E SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE – PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA Scadenza:04-06-2021	G31F20000 000001	1.424.000,00	1.329.740,84
M5.3 SCUOLA EX MARTIRI DELLA LIBERTA	MINISTERO DELL'INTERNO				G31F20000 010001	6.824.000,00	6.496.345,00
TOTALE						8.248.000,00	7.826.085,84

9. FONDO OPERE INDIFFERIBILI (F.O.I.)

Per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il c.d. D.L. Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta. Nello specifico, l'articolo 26, comma 7, del predetto D.L. n. 50/2022 ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, finalizzato a consentire l'avvio entro il 31/12/2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12 settembre 2022, sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Le risorse sono state assegnate alle stazioni appaltanti con il decreto firmato dal Ragioniere Generale dello Stato il 18 novembre 2022, emanato in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022 nonché dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2022.

L'incremento di risorse F.O.I per il Comune di Asti è riepilogato nella seguente tabella:

M2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA								
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/ DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	Incremento del 10% - FOI
M2.8 - Cavalcavia/Cav alcaferrovia Giolitti "Corso Gramsci" - intervento di manutenzione straordinaria su Cavalcavia/Cav alcaferrovia Giolitti	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	G37H20001160001	994.000	994.000,00	99.400,00
M2.9 - Passerella pedonale corso Savona – Intervento di nuova realizzazione di passerella pedonale in Corso Savona parallela al ponte ferroviario sulla linea TO-GE	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	G31B20000600001	995.000	995.000,00	99.500,00
M2.10- Strade comunali zona urbana comune di Asti zona Urbana interventi di manutenzione straordinaria su infrastrutture viarie in zona urbana (Muro di Via Mattarella e di Via Fara)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	G37H20001170001	169.000	169.000,00	16.900,00

M2.11- Strade comunali zona extra urbana - Interventi di manutenzione straordinaria su infrastrutture varie in zona extraurbana.	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	G37H20001180001	986.000	986.000,00	98.600,00
M2.12 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE DELL'INFANZIA - SCHEDA 424/2020 -	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2 – C4 . INVESTIMENTO 2.2 – MEDIE OPERE	G34H20000640001	350.000,00	350.000,00	35.000,00
M2.13 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE PRIMARIE SCHEDA 425/2020 -	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2 – C4 . INVESTIMENTO 2.2 – MEDIE OPERE	G34H20000650001	450.000,00	450.000,00	45.000,00
M2.14 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - SCHEDA 426/2020 -	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO / MIN INTERNO comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 2 – C4 . INVESTIMENTO 2.2 – MEDIE OPERE	G37H20001160001	350.000,00	350.000,00	35.000,00
TOTALE						18.053.328,00	17.623.928,00	429.400,00

M4 – ISTRUZIONE E RICERCA								
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/ DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	Incremento del 10% - FOI
M4.1 - AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK"	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense"	G34E22000150006	560.000	560.000,00	56.000,00
M4.3 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI RELATIVAMENTE ALL'ASILO NIDO "LO SCOIATTOLO" (AMMESSO CON RISERVA – INVIATE INTEGRAZIONI IL 13/09/22) (AMMESSO IN VIA DEFINITIVA – NOTA DEL 26/10/2022)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"	G38I22000260006	1.010.000	1.010.000,00	101.000,00
TOTALE						1.570.000	1.570.000,00	157.000,00

M5 – INCLUSIONE E COESIONE								
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/ DECRETO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	Incremento del 10% - FOI
M5.1b - ALLOGGI ERP	MINISTERO DELL'INTERNO	RIGENERAZIONE URBANA 2021 – MIN. INTERNO - DECRETO 21/01/2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 5 C2 – PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA	G39121006290001	733.900	733.900,00	73.390,00
M5.1 d SCUOLA LAIOLO - FRAZIONE SAN CARLO	MINISTERO DELL'INTERNO	RIGENERAZIONE URBANA 2021 – MIN. INTERNO - DECRETO 21/01/2021	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 5 C2 – PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA	G38121000600001	1.440.000	1.440.000	144.000,00
M5.3 - REALIZZAZIONE E NUOVA PALESTRA IN LOC. FONTANINO	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Avviso pubblico di invito a manifestare interesse PNRR, missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVEST 3.1: SPORT E INCLUS SOCIALE – CLUSTER 1 E 2	G35B22000270006	1.500.000	1.500.000	150.000,00
M5.4 RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA GERBI	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Avviso pubblico di invito a manifestare interesse PNRR, missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVEST 3.1: SPORT E INCLUS SOCIALE – CLUSTER 1 E 2	G33122000060006	1.000.000	1.000.000	100.000,00
TOTALE						4.673.900	4.673.900,00	467.390,00

L'Italia ha presentato alla Commissione europea una proposta di modifica del PNRR finalizzata ad adeguare il Piano per tenere conto:

- da un lato, della necessità di inserire le nuove misure legate all'iniziativa REPOWEREU (per la quale l'Italia beneficia di ulteriori 2,7 miliardi di euro di contributo a fondo perduto);
- dall'altro, per fronteggiare le difficoltà di attuazione legate all'inflazione e alla guerra in Ucraina;

Il Consiglio UE con Decisione dell'8/12/2023 dell'8 dicembre 2023 (entrata in vigore 11 dicembre 2023), ha disposto l'incremento di 2,9 miliardi di euro dell'importo complessivo dei fondi a favore dell'Italia (attualmente pari a 194,4 miliardi di euro) con l'inserimento della nuova Missione 7 RePowerEU e una serie di modifiche alle misure originariamente previste.

Le modifiche al PNRR possono essere raggruppate in 4 macro tipologie, di cui due riferite alle risorse:

- Definizioni di alcune misure per l'intero importo (es. Piccole e medie opere) o parzialmente
- Riallocazione delle risorse finanziarie tra misure, spostando i fondi da misure che presentano scarso tiraggio verso misure che hanno evidenziato maggiori esigenze di spesa

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Tra i principali contenuti di interesse sono evidenziato nel presente Report quelli riguardanti le piccole e medie opere, gli interventi di rigenerazione urbana e di sport e inclusione.

11. PICCOLE OPERE

Con l'istituzione del PNRR sono confluiti in esso finanziamenti statali già attivi (c.d. progetti in essere) destinati ad investimenti di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, le c.d. "piccole opere" ex art. 1 c.29 e ss. L. 160/2019.

L'Art. 33 del D.L. 19/2024, che modifica, integra e abroga diversi commi della L. 160 del 2019, prevede quanto segue:

- ❖ **Termine ultimo per inserimento CUP:** entro **30 aprile 2024**: obbligo di inserimento dei **CUP** per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, pena revoca delle risorse (co. 1, lett. a), c) e d);
- ❖ **Termine avvio dei lavori:** con le modifiche introdotte al comma 32, viene chiarito che il **Comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo**, non più per l'inizio dell'esecuzione bensì per l'aggiudicazione dei lavori.
- ❖ **Termine di conclusione dei lavori:** per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi, a pena di revoca del contributo, entro il termine unico del 31 dicembre 2025;
- ❖ **Gestione delle economie:** per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene in ogni caso

possibile l'utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024 (co. 1, lett.e).

❖ **Semplificazione modalità erogazione delle risorse:** Il nuovo comma 33 mira a velocizzare l'erogazione dei contributi prevedendo un ritorno alle modalità originarie ma con l'utilizzo del sistema ReGis. Si prevede l'erogazione di una prima quota pari al 50% del contributo concesso previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e una quota del **50%** previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50% di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui comma 35, nonché, l'ulteriore 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGis, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36. (co. 1 lett. f). In particolare, per il pagamento:

- della prima quota pari al 50%, il Comune deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n.36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023, che interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)) e associare il CIG su ReGis nella sezione "Procedure di aggiudicazione";
- per il restante 50%, il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGis "Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto" in corrispondenza della medesima fase. I comuni che abbiano già inserito il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione in altre sezioni di ReGis sono comunque tenuti a caricare tali documenti nella su indicata sezione di ReGis "Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto" in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo. Ai fini dell'erogazione delle tranche di pagamento, il SA non è tenuto a caricare alcuna documentazione giustificativa di spesa poiché la sezione "Gestione Spese" viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGis con l'Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto "Modifica" in basso a destra occorre selezionare il tasto "Aggiungi da sistema esterno". Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell'ambito del progetto cliccando sull'icona "Aggiungi" e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asterisco

❖ **Gestione del portale ReGis:** anche se le risorse sono fuoriuscite dal PNRR resta l'obbligo di alimentare il sistema ReGis anche se con modalità semplificate. **La mancata alimentazione del sistema REGIS comporta la revoca del contributo** e l'adempimento sostituisce l'obbligo di rendicontazione ex art. 158 TUEL. Si precisa che il SA dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGis, entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto, corredato dall'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGis nelle modalità che saranno dettagliate dal Manuale di istruzioni semplificato, attualmente in corso di pubblicazione. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti su ReGis sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione

dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS. Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla rendicontazione integrale dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all'ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS. Si precisa che i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti, tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione, sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

La norma in oggetto interessa i seguenti interventi:

M2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA						
OGGETTO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	SCADENZE	STATO DI ATTUAZIONE
M2.6 a) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CAGNI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E CALDAIA	M 2- C4 –I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – D.M. 30-1-2020 E D.M. 11-11-2020 – INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024.	G39E20000270001	170.000,00	170.000,00		CONCLUSO INTERVENTO IN DATA 14/01/2021
M2.6 b) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA SAN DOMENICO SAVIO, VIA TOSI N. 24, - SOSTITUZIONE SERRAMENTI		G31D21000230001	170.000,00	170.000,00		CONCLUSO INTERVENTO IN DATA 1/12/2021
M2.6 c) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CAVOUR, VIA COMENTINA, 10, - SOSTITUZIONE		G31D21000220001	170.000,00	170.000,00		CONCLUSO INTERVENTO IN DATA 29/12/2021

SERRAMENTI						
M2.6 d) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI- SCUOLA PRIMARIA F.BARACCA SOSTITUZIONE SERRAMENTI	M 2- C4 –I2.2 EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – D.M. 30-1-2020 E D.M. 11-11- 2020 – INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024.	G34D22000000001	170.000,00	170.000,00		CONCLUSO INTERVENTO IN DATA 08/06/2023
M2.6 e) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI- FONDI ANNO 2023 SCUOLA LAJOLO INFISSI PARTE VECCHIA	M 2- C4 – INVESTIMENTO 2.2 PICCOLE OPERE – ANNO 2023	G34D22004250006	170.000,00	170.000,00		CONCLUSO INTERVENTO IN DATA 03/04/2025
M2.6 f) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI- FONDI ANNO 2024 SCUOLA CAGNI INFISSI PALESTRA	M 2- C4 – INVESTIMENTO 2.2 PICCOLE OPERE – ANNO 2024	G34D22004260006	170.000,00	170.000,00		CONCLUSO INTERVENTO IN DATA 31/10/2025

12. MEDIE OPERE

Ricordiamo che sono confluiti nel PNRR finanziamenti statali già attivi (c.d. progetti in essere) destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le c.d. “medie opere” ex art.1 c.139 e ss. L.145/2018

Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti gli interventi ricompresi nelle MEDIE OPERE che in forza dell’art 1 sono **completamente fuoriusciti dal PNRR** e restano finanziati da fondi statali. Al fine di operare un monitoraggio il legislatore ha operato alcune scelte organizzative che in parte legano ancora al procedimento di gestione dei fondi PNRR.

L’articolo 32 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.145 del 2018. Tale Articolo prevede quanto segue:

- ❖ **Termine conclusione lavori:** Ai sensi del novellato comma 139-ter, le risorse assegnate ai Comuni per gli anni 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2023. I Comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021-2022-2023-2024-2025, sono tenuti a **concludere i lavori** entro il **31 marzo 2026** (co.1, lett. b);
- ❖ **Termine avvio dei lavori:** La regola generale seguita fino all’entrata del D.L. 19/2024 è stata che l’inizio dei lavori doveva avvenire entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (15 novembre per il 2020 e 31 dicembre per il 2021) e che la conclusione dei lavori dovesse avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

Con la modifica al comma 143, le assegnazioni che decorrono dal 2026 devono rispettare il termine del 15 settembre 2025 per la richiesta di contributi relativi al triennio 2026-2028 e del 15 settembre 2028 per la richiesta di contributi relativi al triennio 2029-2031. (co.1, lett. d) 1 e 2);

Sono azzerati gli stanziamenti per l’anno 2027.

È fatto divieto di assegnazione a enti che hanno già ricevuto precedenti contributi allo stesso titolo al triennio precedente.;

- ❖ **Affidamento e aggiudicazione** - La lettera f) prevede una sostituzione all’interno del comma 143 *“L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:*
 - a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;*
 - b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;*
 - c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;*
 - d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.”*

Affidare e affidamento devono essere sostituiti con aggiudicare e aggiudicazione perché è precisato che tali termini vanno rispettati con riguardo al momento dell’aggiudicazione dei lavori e non più a quello del loro affidamento. Solo per le annualità 2021/2022 il termine è riferito all’affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l’affidamento diretto (co.1, lett. f) punto 2);

- ❖ **Gestione delle economie** - Si prevede inoltre che i **risparmi** derivanti da eventuali **ribassi d’asta** sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell’opera. Eventuali economie di progetto NON restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato (co 1, lett f) n. 3);

- ❖ **Gestione del portale ReGis** - inoltre confermato l'obbligo di alimentazione del sistema REGIS almeno "entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione dell'opera", pena la restituzione del contributo erogato. La rendicontazione su **ReGiS** esclude l'obbligo di cui all'art. 158 TUEL (co.1, lett. g), n.2);
- ❖ **Semplificazione modalità erogazione delle risorse** che ai sensi del comma 144 sono state riformulate nel modo seguente:
 - per il 20% a titolo di Acconto;
 - per il 10% previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori;
 - per il 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori;
 - per il restante 10% previa trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (co.1, lett. g), n.2);

I comuni che abbiano già inserito il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione in altre sezioni di ReGiS sono comunque tenuti a caricare tali documenti nella su indicata sezione di ReGiS "Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto" in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo.

Si precisa che il Comune dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto sulla piattaforma ReGiS nelle modalità dettagliate dal manuale in corso di adozione. Inoltre, il rendiconto delle spese sostenute dal Comune deve essere corredato dall'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS. Si chiarisce che l'attestazione delle verifiche è esclusivamente di tipo amministrativo-contabile.

- **10% previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori:** il SA deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme certificate di cui al decreto legislativo n.36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023), associare il CIG su ReGiS nella sezione "Procedure di aggiudicazione", mentre non è tenuto a caricare alcuna documentazione;
- **60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori:** il Comune deve alimentare correttamente la sezione "Gestione spese". In generale la richiamata sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l'Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto "Modifica" in basso a destra occorre selezionare il tasto "Aggiungi da sistema esterno". Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell'ambito del progetto cliccando sull'icona "Aggiungi" e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asteriscoma. Si precisa che le erogazioni effettuate nei confronti dei Comuni beneficiari vengono calcolate tenendo conto dei giustificativi di spesa comprensivi anche degli importi precedentemente assegnati (pari al 30%), determinando così l'ammontare dell'erogazione spettante per singolo Ente che non dovrà in nessun caso essere superiore al 90% del contributo concesso;
- **Saldo del 10%:** il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS "Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto" in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo. Contestualmente, il Comune beneficiario è tenuto a censire le eventuali Economie di progetto, a conclusione dell'opera, nell'apposita tab "Economie" - sezione "Gestione Fonti".

I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla **rendicontazione parziale** dei progetti su ReGiS sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla **rendicontazione integrale dei progetti su ReGiS**, non sono tenuti all'ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Si precisa che i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti, tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione, sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Tale norma interessa i seguenti interventi:

M2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA						
OGGETTO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	SCADENZE	STATO DI ATTUAZIONE
M2.8 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CAVALCAVIA/CAVAL CAFERROVIA GIOLITTI - SCHEDA 158/2020	Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	G37H20001160001	994.000,00	994.000,00	L'avviso del decreto dell'8/11/2021 è stato pubblicato in gazzetta il 22/11/2021 . https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/22/21A06946/sg da tale data	CONCLUSO INTERVENTO A NOVEMBRE 2024 MA CONTENZIOSO IN CORSO CON DITTA APPALTATRICE
M2.9 INTERVENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSARELLA PEDONALE IN CORSO SAVONA PARALLELA AL PONTE FERROVIARIO SULLA LINEA TO-GE - SCHEDA 887/2020	Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	G31B20000600001	995.000,00	995.000,00	decorrono pertanto i termini per indire le procedure di gara a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;	AVVIATO INTERVENTO – LAVORI IN CORSO
M2.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE VIARIE IN ZONA URBANA - SCHEDA 888/2020 -	Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	G37H20001170001	169.000,00	169.000,00	b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;	CONCLUSO INTERVENTO
M2.11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE VIARIE IN ZONA EXTRAURBANA - SCHEDA 889/2020 -	Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	G37H20001180001	986.000,00	986.000,00	c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;	CONCLUSO INTERVENTO
M2.12 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE DELL'INFANZIA - SCHEDA 424/2020 -	Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	G34H20000640001	350.000,00	350.000,00	d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.	CONCLUSO INTERVENTO RENDICONTO FINALE 22/10/2024

M2.13 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE PRIMARIE SCHEDA 425/2020 -	Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	G34H20000650001	450.000,00	450.000,00	- 31/03/2026 conclusione dei lavori	AVVIATO INTERVENTO – LAVORI IN CORSO
M2.14 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - SCHEDA 426/2020 -	Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	G37H20001160001	350.000,00	350.000,00		CONCLUSO RENDICONTO FINALE AGOSTO 2024

13. INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

Anche nel caso della rigenerazione urbana, la norma dispone un **parziale definanziamento**, rispetto alle risorse PNRR, compensato con il mantenimento del finanziamento nazionale originario. In sostanza la confluenza nel PNRR delle risorse dedicate i progetti di rigenerazione urbana viene limitata a 1,5 miliardi di euro (su 2,9 mld. complessivi), mentre le restanti risorse continuano ad essere assicurate dai fondi nazionali originari. Anche per questa misura il ridimensionamento del concorso del PNRR al finanziamento non sembra comportare una modifica della disciplina della misura per nessuno dei progetti indicati, che restano inquadrati nelle regole del Piano.

Unica novità, ferma restando la necessità di assicurare il target finale, è la possibilità di «prorogare» i termini finali per alcune opere ricomprese nella linea di finanziamento rigenerazione urbana. Tale norma interessa due interventi:

M5. INCLUSIONE E COESIONE

OGGETTO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
M5.1b ALLOGGI ERP	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 5 C2 – PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA	G39J2100629000 1	733.900,00	733.900,00
M5.1 d SCUOLA LAIOLO - FRAZIONE SAN CARLO	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 5 C2 – PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA	G38I2100060 0001	1.440.000,00	1.440.000,00

14 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE

Art 19 comma 1

La norma concede agli enti attuatori degli interventi relativi al PNRR “Sport e Inclusione Sociale”, previo assenso da parte del Dipartimento per lo Sport, di utilizzare i ribassi d’asta realizzati per far fronte, oltre che a varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d’opera, nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti pubblici applicabile *ratione temporis* (art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 o art. 120 D.lgs. 36/2023), anche all’aggiornamento dei prezzi a seguito degli incrementi dei prezzi.

Tale norma interessa due interventi:

M5. INCLUSIONE E COESIONE							
OGGETTO	ENTE FINANZIATORE	BANDO/DECRET O	SETTORE INTERESSAT O	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR
M5.3 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN LOC. FONTANINO	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Avviso pubblico di invito a manifestare interesse PNRR, missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”	Lavori pubblici ed edilizia pubblica	MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVEST 3.1: SPORT E INCLUS SOCIALE – CLUSTER 1 E 2	G35B22000270006	1.500.000,00	1.500.000,00
M5.4 RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA GERBI	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Avviso pubblico di invito a manifestare interesse PNRR, missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”	Lavori pubblici ed edilizia pubblica	MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVEST 3.1: SPORT E INCLUS SOCIALE – CLUSTER 1 E 2	G33122000060006	1.000.000,00	1.000.000,00

Per entrambi gli interventi è stata inviata in data 12 marzo 2024 la richiesta di autorizzazione a disporre delle economie derivanti dai ribassi d’asta.

15. QUADRO DI RIEPILOGO SOMME FINANZIATE E SUCCESSIVE MODIFICHE

OGGETTO	CUP	SETTORE INTERESSATO	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	STRALCIATO A CAUSA DEL DL 19	TOTALE PNRR
M1.1 ADOZIONE APP IO	G31F22001100006	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	32.760,00	32.760,00	00,00	NO	32.760,00
M1.2 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	G31F22004220006	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	80.124,00	80.124,00	00,00	NO	80.124,00
M1.3 ADOZIONE SP SPID CIE	G31F23000360006	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	14.000,00	14.000,00	00,00	NO	14.000,00
M 1.4 ADOZIONE "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI	G31F22003010006	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	59.966,00	59.966,00	00,00	NO	59.966,00
M1.5 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI – COMUNI	G31C23000020006	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	352.652,00	352.652,00	00,00	NO	352.652,00

M1.6 a) PROMOZIONE DELLA ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEI CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO SPAZIO KOR	G34H22000150001	CULTURA, MANIFESTAZIO NI, ISTITUTI CULTURALI, RICERCA FINANZIAMENTI	312.423,87	250.000,00	00,00	NO	250.000,00
M1.6 b) PROMOZIONE DELLA ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEI CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO ALFIERI	G34H22000130001	CULTURA, MANIFESTAZIO NI, ISTITUTI CULTURALI, RICERCA FINANZIAMENTI	619.076,57	400.000,00	00,00	NO	400.000,00
M 1.9 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI”	G31F22003670006	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE	328.160,00	328.160,00	00,00	NO	328.160,00
M 1.10 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE – DATI – COMUNI	G51F22004800006	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE	162.748,00	162.748,00	00,00	NO	162.748,00
M 1.11 RETI DI FACILITAZIONE AL DIGITALE	G39I23001490006	SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	152.915,84	152.915,84	00,00	NO	152.915,84
M1.12 – DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP	G31F24000240006	SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE	62.698,96	62.698,96	00,00	NO	62.698,96

M1.13 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 8ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	G51F24003630006	SETTORE RAGIONERIAIA, BILANCIO, TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI	16.274,80	16.274,80	00,00	NO	16.274,80
M1.16 – DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP – ENTI TERZI - COMUNI	G31F25000430006	SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	27.452,56	27.452,56	00,00	NO	27.452,56
TOTALE MISSIONE 1			2.221.252,60	1.939.752,16	00,00		1.939.752,16

MISSIONE 1	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	TOTALE CONTRIBUTO PNRR
SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONIE, RICERCA FINANZIAMENTI	931.500,44	650.000,00	0	650.000,00
SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	1.030.410,00	1.030.410,00	0	1.030.410,00
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI	152.915,84	152.915,84	0	152.915,84
SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	90.151,52	90.151,52	0	90.151,52
SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO, TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI	16.274,80	16.274,80	0	16274,8
TOTALE	2.221.252,60	1.939.752,16	0	1.939.752,16

OGGETTO	CUP	SETTORE INTERESSATO	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	STRALCIATO A CAUSA DEL DL 19	TOTALE IN GESTIONE PNRR
M2.5 a) RINNOVO AUTOBUS A COMBUSTIBILI PULITI	G30J220000000001	APPALTI E CONTRATTI	6.909.928,00	6.909.928,00	00,00	NO	6.909.928,00
M2.5 b) RINNOVO AUTOBUS A COMBUSTIBILI PULITI	I30J210000000008	APPALTI E CONTRATTI	5.400.000,00	5.400.000,00	00,00	NO	5.400.000,00
M2.6 a) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CAGNI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E CALDAIA	G39E20000270001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	170.000,00	170.000,00	00,00	SI – PICCOLE OPERE	00,00
M2.6 b) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA SAN DOMENICO SAVIO, VIA TOSI N. 24, - SOSTITUZIONE SERRAMENTI	G31D21000230001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	170.000,00	170.000,00	00,00	SI – PICCOLE OPERE	00,00
M2.6 c) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CAVOUR, VIA COMENTINA, 10, - SOSTITUZIONE SERRAMENTI	G31D21000220001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	170.000,00	170.000,00	00,00	SI – PICCOLE OPERE	00,00

M2.6 d) REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI- SCUOLA PRIMARIA F. BARACCA SOSTITUZIONE SERRAMENTI	G34D22000000001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	170.000,00	170.000,00	00,00	SI – PICCOLE OPERE	00,00
M2.6 e) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – FONDI ANNO 2023	G34D22004250006	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	170.000,00	170.000,00	00,00	SI – PICCOLE OPERE	00,00
M2.6 f) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – FONDI ANNO 2024	G34D22004250006	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	170.000,00	170.000,00	00,00	SI – PICCOLE OPERE	00,00
M2.8 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CAVALCAVIA/CAVAL CAFERROVIA GIOLITTI - SCHEDA 158/2020	G37H20001160001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	994.000,00	994.000,00	99.400,00	SI – MEDIE OPERE	00,00
M2.9 INTERVENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSARELLA PEDONALE IN CORSO SAVONA PARALLELA AL PONTE FERROVIARIO SULLA LINEA TO-GE - SCHEDA 887/2020	G31B20000600001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	995.000,00	995.000,00	99.500,00	SI – MEDIE OPERE	00,00
M2.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE VIARIE IN ZONA URBANA - SCHEDA 888/2020 -	G37H20001170001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	169.000,00	169.000,00	16.900,00	SI – MEDIE OPERE	00,00

M2.11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE VIARIE IN ZONA EXTRAURBANA - SCHEDA 889/2020 -	G37H20001180001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	986.000,00	986.000,00	98.600,00	SI – MEDIE OPERE	00,00
M2.12 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE DELL'INFANZIA - SCHEDA 424/2020 -	G34H20000640001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	350.000,00	350.000,00	35.000,00	SI – MEDIE OPERE	00,00
M2.13 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE PRIMARIE SCHEDA 425/2020 -	G34H20000650001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	450.000,00	450.000,00	45.000,00	SI – MEDIE OPERE	00,00
M2.14 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - SCHEDA 426/2020 -	G37H20001160001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	350.000,00	350.000,00	35.000,00	SI – MEDIE OPERE	00,00
TOTALE MISSIONE 2			17.623.928,00	17.623.928,00	429.400,00		12.309.928,00

MISSIONE 2	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	TOTALE IN GESTIONE PNRR
SETTORE APPALTI E CONTRATTI	12.309.928,00	12.309.928,00	0	12.309.928,00

OGGETTO	CUP	SETTORE INTERESSATO	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	STRALCIATO A CAUSA DEL DL 19	TOTALE IN GESTIONE PNRR
M4.1 AMPLIAMENTO MENZA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK"	G34E22000150006	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	560.000,00	560.000,00	56.000,00	NO	616.000,00
M4.3 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI RELATIVAMENTE ALL'ASILO NIDO "LO SCOIATTOLO"	G38I22000260006	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	1.010.000,00	1.010.000,00	101.000,00	NO	1.111.000,00
M4.4 SCUOLA RIO CROSIO	G31F19000170001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	8.256.800,00	7.882.228,00	00,00	NO	7.882.228,00
TOTALE			9.826.800,00	9.452.228,00	157.000,00		9.609.228,00

MISSIONE 4	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	TOTALE IN GESTIONE PNRR
SETTORE APPALTI E CONTRATTI	9.826.800,00	9.452.228,00	157.000,00	9.609.928,00

OGGETTO	CUP	SETTORE INTERESSATO	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	STRALCIATO A CAUSA DEL DL 19	TOTALE IN GESTIONE PNRR
M5.1 a) SCUOLA D'INFANZIA SANTA CATERINA	G31F20000000001	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	1.424.000,00	1.329.740,84	RINUNCIATO		
M5.1 b) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PROBLEMI VETUSTA' ALLOGGI ERP	G39J21006290001		733.900,00	733.900,00	73.390,00	NO	807.290,00
M5.1 c) SCUOLA EX MARTIRI DELLA LIBERTA	G31F20000010001		6.824.000,00	6.496.345,00	RINUNCIATO		
M5.1 d) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA PRIMARIA LAIOLO - FRAZIONE SAN CARLO	G38I21000600001		1.440.000,00	1.440.000,00	144.000,00	NO	1.584.000,00
M 5.2 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione	G34H22000370007	SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	330.000,00	330.000,00	00,00	NO	330.000,00
M5.3 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN LOC. FONTANINO	G35B22000270006	Lavori pubblici ed edilizia pubblica	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	NO	1.650.000,00
M5.4 RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA GERBI	G33I22000060006	Lavori pubblici ed edilizia pubblica	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	NO	1.100.000,00

M 5.6 a)1 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro	G34H22000390007	POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI	715.000,00	715.000,00	00,00	NO	715.000,00
M 5.6 a)2 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro	G34H22000800007		238.333,32	238.333,32	00,00	NO	238.333,32
M 5.6 b)3 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	G34H22000380007		210.000,00	210.000,00	00,00	NO	210.000,00
M 5.6 c) Povertà estrema – Stazioni di posta	G34H22000410007	SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	750.000,00	750.000,00	00,00	NO	750.000,00
M 5.6 d) Housing first	G34H22000400007		710.000,00	710.000,00	00,00	NO	710.000,00
M5.11	G39C22000040002	SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	00,00	NO	3.000.000,00
			10.627.233,32	10.627.233,32	467.390,00		11.094.623,32

MISSIONE 5	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	TOTALE IN GESTIONE PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	7.673.900,00	7.673.900,00	467.390,00	8.141.290,00
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	2.953.333,32	2.953.333,32	00	2.953.333,32
TOTALE	10.627.233,32	10.627.233,32	467.390,00	11.094.623,32

16. QUADRO DI RIEPILOGO SOMME ATTUALMENTE IN GESTIONE


MISSIONE 1	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	TOTALE CONTRIBUTO PNRR
SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI, RICERCA FINANZIAMENTI	931.500,44	650.000,00	0	650.000,00
SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	1.030.410,00	1.030.410,00	0	1.030.410,00
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI	152.915,84	152.915,84	0	152.915,84
SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	90.151,52	90.151,52	0	90.151,52
SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO, TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI	16.274,80	16.274,80	0	16.274,80
TOTALE	2.221.252,60	1.939.752,16	0	1.939.752,16
MISSIONE 2	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	TOTALE CONTRIBUTO PNRR
SETTORE APPALTI E CONTRATTI	12.309.928,00	12.309.928,00	0	12.309.928,00
MISSIONE 4	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	TOTALE CONTRIBUTO PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	9.826.800,00	9.452.228,00	157.000,00	9.609.228,00
MISSIONE 5	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	TOTALE CONTRIBUTO PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	7.673.900,00	7.673.900,00	467.390,00	8.141.290,00
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	2.953.333,32	2.953.333,32	00	2.953.333,32
TOTALE	10.627.233,32	10.627.233,32	467.390,00	11.094.623,32
FONDO COMPLEMENTARE	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	TOTALE CONTRIBUTO PNRR
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	900.000,00	900.000,00	00	900.000,00
SUPPORTO	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	FOI	TOTALE CONTRIBUTO PNRR
SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONE, ISTITUTI CULTURALI, RICERCA FINANZIAMENTI	80.000,00	80.000,00	00	80.000,00
TOTALE	35.965.213,92	35.309.141,48	624.390,00	35.933.531,48

16.1 QUADRO DI RIEPILOGO SOMME ATTUALMENTE IN GESTIONE SUDDIVISE PER MISSIONI

La tabella 1 evidenzia la ripartizione del contributo P.N.R.R. assegnato al Comune di Asti, e attualmente in gestione, pari a 35.933.531,48 euro suddiviso per Missioni.

La quota maggiore, pari a 12.309.928,00 euro, si registra per la Missione 2 – Rivoluzione Verde e transizione ecologica. A seguire

- Missione 4 – Istruzione e Ricerca. 9.609.228,00 euro
- Missione 5 – Inclusione e Coesione: 11.094.623,32 euro
- Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo: 1.939.752,16 euro
- Fondo complementare : 900.000,00 euro
- Strumenti e iniziative di supporto all’attuazione del P.N.R.R.: 80.000,00 euro

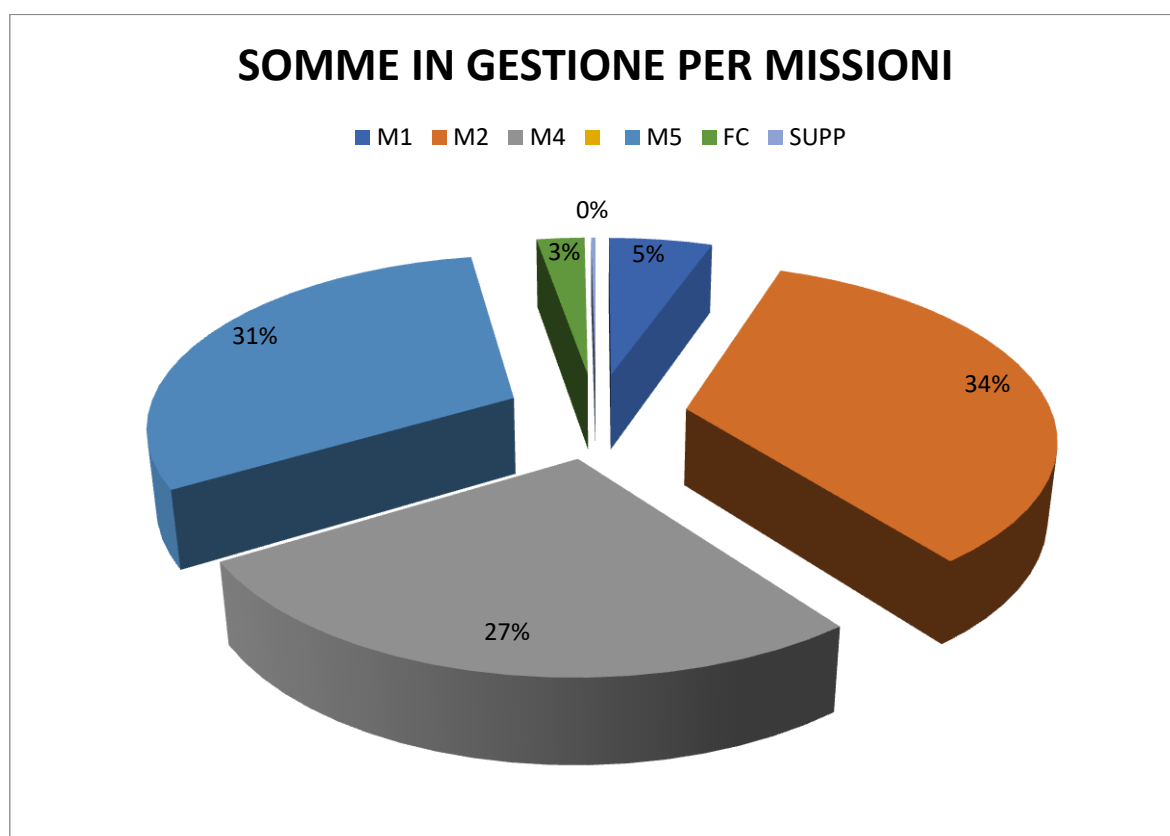


Tab. 1

16. 2 QUADRO DI RIEPILOGO SOMME ATTUALMENTE IN GESTIONE SUDDIVISE PER SETTORI

La tabella 2 evidenzia la ripartizione del contributo P.N.R.R. assegnato al Comune di Asti, e attualmente in gestione, pari a 35.933.531,48 euro suddiviso per Settori.

La quota maggiore, pari a 18.650.518,00 euro, si registra per il Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica. A seguire:


- Settore Appalti e Contratti: 12.309.928,00 euro
- Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi: 3.106.249,16 euro
- Settore Risorse Umane, Sistemi Informativi e Rapporti con le Società Partecipate: 1.030.410,00 euro
- Settore Cultura, Manifestazioni, Istituti Culturali e Ricerca Finanziamenti: 730.000,00 euro
- Settore Urbanistica e attività produttive: 90.151,52 euro
- Settore Ragioneria, Bilancio, Tributi, Demografici: 16.274,80 euro

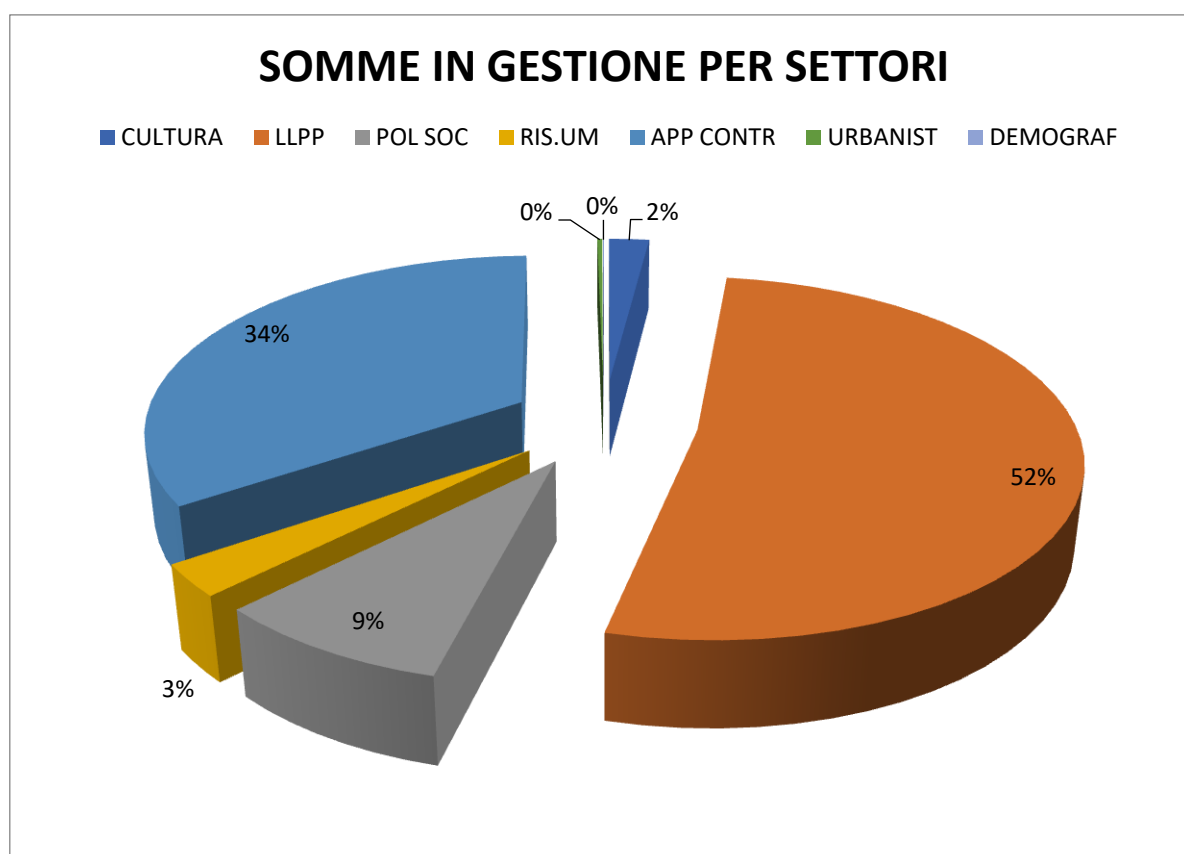

Tab. 2

17. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUALMENTE IN GESTIONE

Una delle sfide maggiori è rappresentata dal rispetto dei tempi imposti dall'Unione Europea: il termine di fine lavori è fissato nel 2026. Abbiamo scelto di accorpate in quattro macro voci gli step che ogni intervento dovrà seguire e precisamente:



M1-DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

Nr	OGGETTO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	SCADENZE	STATO DI ATTUAZIONE
M1. 1	M1.1 ADOZIONE APP IO	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO	G31F22001100006	32.760,00	32.760,00	23-09-2023: conclusione attività	Intervento concluso, rendicontato e liquidato in data 16/04/2024
M1. 2	M1.2 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	G31F22004220006	80.124,00	80.124,00	13/12/2023: conclusione	Intervento concluso, rendicontato e liquidato in data 30/11/2023

M1.3	M1.3 ADOZIONE SP SPID CIE	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE”	G31F23000360006	14.000,00	14.000,00	Contrattualizza zione entro 360 gg Decr. Finanziamento (01-06-2024) – Entro 300 gg conclusione attività	Intervento concluso e rendicontato e liquidato in data 06/12/2024
M1.4	M 1.4 ADOZIONE PIATTAFOR MA NOTIFICHE DIGITALI	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”	G31F22003010006	59.966,00	59.966,00	Entro 03-04- 2023: caricamento contratti Entro 12-09- 2023: conclusione attività	Intervento concluso, rendicontato e liquidato in data 05/04/2024
M1.5	M1.5 ABILITAZION E AL CLOUD	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”	G31C23000020006	352.652,00	352.652,00	02/03/2024 caricamento contratti 04/11/2025 conclusione attività	Intervento in corso di realizzazione
M1.6a)	M1 6 PROMOZION E DELLA ECOEFFICIEN ZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEI CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI – SPAZIO KOR	CULTURA, MANIFESTAZIONI,I STITUTI CULTURALI, RICERCA FINANZIAMENTI	MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 – “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI”	G34H22000150001	312.423,87	250.000,00	31/12/2022: avvio opere 31-12-2025: certificato regolare esecuzione	Avviato intervento. Sono state approvate varianti. Si prevede la conclusione entro il 31/12/2025

M1.6 b)	M1.6 PROMOZIONI E DELLA ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEI CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI – TEATRO ALFIERI	CULTURA, MANIFESTAZIONI, ISTITUTI CULTURALI, RICERCA FINANZIAMENTI –	MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 – “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI”	G34H22000130001	619.076,57	400.000,00	31/12/2022: avvio opere 31-12-2025: certificato regolare esecuzione	Intervento concluso. Certificato Ultimazione Lavori: 22/5/2024 C.R.E: 19/09/2024
M1.9	M 1.9 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI”	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE	M1C1 PNRR Investimento 1.4”SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” parte della Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”	G31F22003670006	328.160,00	328.160,00	01-01-20253: conclusione dei lavori	Intervento concluso. In data 27/6/2025. Richiesta liquidazione
M1.10	M 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI”	SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE	M1C1 PNRR Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’	G51F22004800006	162.748,00	162.748,00	29/7/2023 : stipula contratto con il fornitore; Entro 360gg contrattualizzazione : conclusione attività,	Intervento concluso, rendicontato e liquidato in data 16/05/2024
M 1.11	M 1.1.1.17 RETI DI FACILITAZIONE AL DIGITALE	SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	M 1 C 1 Investimento 1.1.7” Reti di facilitazione al digitale”	G39I23001490006	152.915,84	152.915,84	Data conclusione spostata dal 31/12/2025 al 28/2/2026 Target: 3210 cittadini facilitati e nr. 4 sedi di Punti di facilitazione digitale sul territorio cittadino	In corso
M 1.12	M1.12 – DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP	SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE	M 1 – C 1 – INVESTIMENTO 2.2 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE”	G31F24000240006	62.698,96	62.698,96	Data di conclusione: 1/12/2025	Caricato affidamento in data 23/05/2025. Intervento avviato. Si prevede di terminare entro il 01/12/2025

M1.13	M1.13 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	SETTORE RAGIONERIAIA, BILANCIO, TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI	PNRR – MISURA 1.4.4 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	G51F24003630006	16.274,80	16.274,80	Data di conclusione: 31/12/2025	Intervento avviato
M1.16	M1.16 – DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP – ENTI TERZI - COMUNI	SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	PNRR – MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE)" – ENTI TERZI - COMUNI	G31F25000430006	27.452,56	27.452,56	Termine ultimo per contrattualizzazione: 03/10/2025 Termine di conclusione intervento: 31/01/2026	E' in corso la fase di contrattualizzazione

M2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Nr	OGGETTO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR	SCADENZE	STATO DI ATTUAZIONE
M2.5 a)	M2.5 a) RINNOVO AUTOBUS A COMBUSTIBILI PULITI		M 2 – C2 – INV 4.4. "RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI" SUB INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS"	G30J22000000001	6.909.928,00	6.909.928,00	OBIETTIVI MINIMI 31/12/2024 acquisto 3 autobus 30/06/2026	CONTRATTI DI FORNITURA STIPULATI (4+8 BUS) 4 bus circolanti dal 17/02/2025 4 bus circolanti dal 03/03/2025 4 bus circolanti dal 03/04/2025
M2.5 a)	M2.5 a) RINNOVO AUTOBUS A COMBUSTIBILI PULITI		M 2 – C2 – INV 4.4. "RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI" SUB INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS"	I30J21000000008	5.400.000,00	5.400.000,00	OBIETTIVI MINIMI 30/06/2026 acquisto 9 autobus	CONTRATTI DI FORNITURA STIPULATI (8 BUS) 8 bus circolanti dal 17/02/2025 1 bus consegna prevista entro il 05/12/2025

M4. ISTRUZIONE E RICERCA							
OGGETTO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR		
M4.1 AMPLIAMENTO MENZA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK"	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense"	G34E22000150006	560.000,00	560.000,00	31/03/2023 aggiudicazione appalti; 31/12/2025 conclusione lavori	INTERVENTO CONCLUSO C.R.E al 27.11.2024
M4.3 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI RELATIVAMENTE ALL'ASILO NIDO "LO SCOIATTOLO" (AMMESSO CON RISERVA – INVIA INTEGRAZIONI IL 13/09/22) (AMMESSO INVIA DEFINITIVA – NOTA DEL 26/10/2022)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	G38I22000260006	1.010.000,00	1.010.000,00	20/06/2023 aggiudicazione appalti; 30/11/2023 avvio lavori; 31/12/2025 conclusione lavori; 30/06/2026 collaudo;	INTERVENTO CONCLUSO – C.R.E.: 16/05/2025

M4.4 SCUOLA PRIMARIA RIO CROSIO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"	G31F19000170001	8.256.800,00	7.882.228,00	15/09/2023 aggiudicazione appalti; 30/11/2023 avvio lavori; 31/03/2026 conclusione lavori; 30/06/2026 collaudo;	AVVIATO INTERVENTO – Consegna lavori avvenuta in data 23/10/2023
--	---	---	-----------------	--------------	--------------	--	--

M5. INCLUSIONE E COESIONE							
OGGETTO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR		
M5.1b ALLOGGI ERP	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 5 C2 – PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA	G39J21006290001	733.900,00	733.900,00	- 30/07/2023 Stipula contratto lavori - 30/09/2024 pagare almeno 30% SAL - 31/03/2026 termine lavori	AVVIATO INTERVENTO IN DATA 04/08/2023 Dopo una sospensione i lavori sono ripresi e si prevede la fine lavori per il 31.12.2025
M5.1 d SCUOLA LAIOLO - FRAZIONE SAN CARLO	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	M 5 C2 – PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA	G38J21000600001	1.440.000,00	1.440.000,00		AVVIATO INTERVENTO IN DATA 13/09/2023
M5.2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione - 1.1.3	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 SUB INVESTIMENTI 1.1.3	G34H22000370007	330.000,00	330.000,00	Target: 125 persone sostenute. La persona si intende 'sostenuta' quando sono stati attivati tutti i servizi previsti nel suo piano di assistenza individuale 30/06/2026 conclusione intervento	AVVIATO INTERVENTO in data 03/07/2024 IN CORSO DI REALIZZAZIONE

M5.3 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN LOC. FONTANINO	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	MISSIONE 5 – COMPONENTE 2	G35B22000270006	1.500.000,00	1.500.000,00	31/03/2023 aggiudicazione appalti 31/01/2026 conclusione lavori Intervento con problematiche che non consenso noto la realizzazione dell'opera.	AVVIATO INTERVENTO IN DATA 20/09/2023 In data 18/3/2025 con DD nr 593 Risoluzione del contretto 20/3/2025 la ditta con Ricorso ha aperto il contenzioso
M5.4 RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA GERBI	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	– INVEST 3.1: SPORT E INCLUS SOCIALE – CLUSTER 1 E 2	G33I22000060006	1.000.000,00	1.000.000,00	31/03/2023 aggiudicazione appalti 31/01/2026 conclusione lavori	AVVIATO INTERVENTO IN DATA 22/05/2023
M 5.6 a) 1 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro	POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPON ENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	G34H22000390007	715.000,00	715.000,00	Target: 12 beneficiari che hanno completato tutte le attività previste nel progetto individualizzato.	AVVIATO INTERVENTO – SERVIZI IN CORSO
M 5.6 a) 2– Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro			G34H22000800007	238.333,32	238.333,32	Target: 4 beneficiari che hanno completato tutte le attività previste nel loro progetto personalizzato	AVVIATO INTERVENTO – SERVIZI IN CORSO
M 5.6 b) RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 – LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENT O DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	G34H22000380007	210.000,00	210.000,00	Target: completamento di tutte le ore di supervisione previste dal POA. Conclusione intervento: data spostata dal 31/03/2026 al 30/06/2026	AVVIATO INTERVENTO – SERVIZI IN CORSO

M 5.6 c) HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA	POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 – LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA	G34H22000410007	750.000,00	750.000,00	Target: 50 beneficiari per i quali sia stata effettuata una presa in carico Conclusione intervento: data spostata dal 31/03/2026 al 30/06/2026	AVVIATO IN DATA 31/01/2024 – SERVIZI IN CORSO
M 5.6 d) HOUSING FIRST PER PERSONE SENZA DIMORA	POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 – LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST	G34H22000400007	710.000,00	710.000,00	Target: 15 beneficiari per cui è previsto uno spazio abitativo per almeno sei mesi e relativa presa in carico	AVVIATO INTERVENTO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 SERVIZI IN CORSO
M 5.11 PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA	MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 POTENZIAMENT O DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	G39C22000040002	3.000.000,00	3.000.000,00	30/11/2025: conclusione dei lavori	IN FASE DI PROGETTAZIONE – VERIFICA IN CORSO

FONDO COMPLEMENTARE							
OGGETTO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO PNRR		
FC 1 Riqualficazione dell'edilizia residenziale pubblica – via Catalani	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA, POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI,	PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: "RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"	G38I21004210001	900.000,00	900.000,00	- 30/06/2022 - affidamento della progettazione degli interventi - 30/09/2022 - approvazione della progettazione esecutiva - 31/12/2022 - pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione degli interventi - 31/03/2023 - aggiudicazione dei contratti - 30/06/2023 - consegna/avvio dei lavori - 31/12/2024 - realizzazione del 50% dei lavori - 31/03/2026 - ultimazione dei lavori e approvazione del certificato di collaudo	AVVIATO INTERVENTO – LAVORI IN CORSO


STRUMENTI E INIZIATIVE A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PNRR							
OGGETTO	SETTORE INTERESSATO	MISURA PNRR	CUP	IMPORTO SCHEDA	CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO	SCADENZE	CONTRIBUTO PNRR
StrS 1 Progetto #ECOTEATRIASTI	CULTURA, MANIFESTAZIONI E, ISTITUTI CULTURALI, RICERCA FINANZIAMENTI	MISSIONE 1 COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI"	G34H22000130001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	CONCLUSO INTERVENTO

18 – TABELLA STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI MISSIONE 1

Le tabelle che seguono illustrano la suddivisione degli interventi finanziati dal PNRR- MISSIONE 1 per stadio di avanzamento.

Su 11 interventi finanziati 2 sono al primo step, attività che precede l'affidamento, per 4 sono stati avviati gli interventi (Step 3) e 5 all'ultimo step in quanto l'intervento è stato realizzato.

MISSIONE 1	M1.1	M1.2	M1.3	M1.4	M1.5	M1.6a	M1.6b	M1.9	M1.10	M1.11	M1.12	M1.13	M1.16
SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI, RICERCA FINANZIAMENTI													
SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE													
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONI E SERVIZI EDUCATIVI													
SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE													
SETTORE RAGIONERIA BILANCIO TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI													

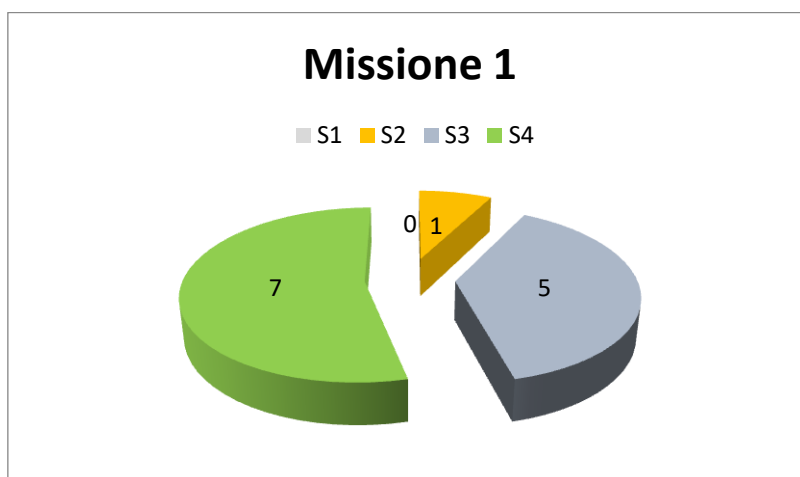

19 – TABELLA STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI MISSIONE 2

Le tabelle che seguono illustrano la suddivisione degli interventi finanziati dal PNRR- MISSIONE 2 per stadio di avanzamento.

Su 2 interventi finanziati rimasti nella Missione 2 4 sono al primo step , 1 al secondo che è contraddistinto dall'aver stipulato un contratto di appalto o di servizio mentre l'altro è in parte allo step 1 in parte al primo step.


MISSIONE 2	M2.5 a)	M2.5 a)
SETTORE APPALTI E CONTRATTI		



20 –TABELLA STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI MISSIONE 4

Le tabelle che seguono illustrano la suddivisione degli interventi finanziati dal PNRR- MISSIONE 4 per stadio di avanzamento. Tutti e tre gli interventi finanziati sono al terzo step: gli interventi sono stati avviati.


MISSIONE 4	M4.1	M 4.3	M 4.4
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA			

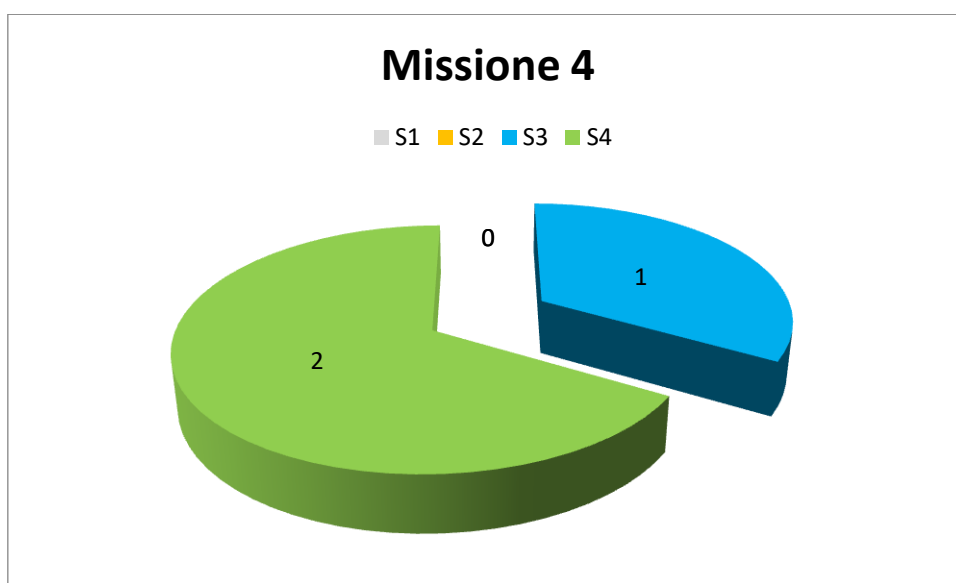

21 –TABELLA STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI MISSIONE 5

Le tabelle che seguono illustrano la suddivisione degli interventi finanziati dal PNRR- MISSIONE 5 per stadio di avanzamento. Su 11 interventi finanziati 8 sono al primo step, 1 al secondo e 2 al terzo.

MISSIONE 5	M5.1 b	M5.1 d	M5.2	M5.3	M5.4	M5.6 a)1	M5.6 a) 2	M5.6b)	M5.6c)	M5.6 d)	M5.11
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA											
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI											

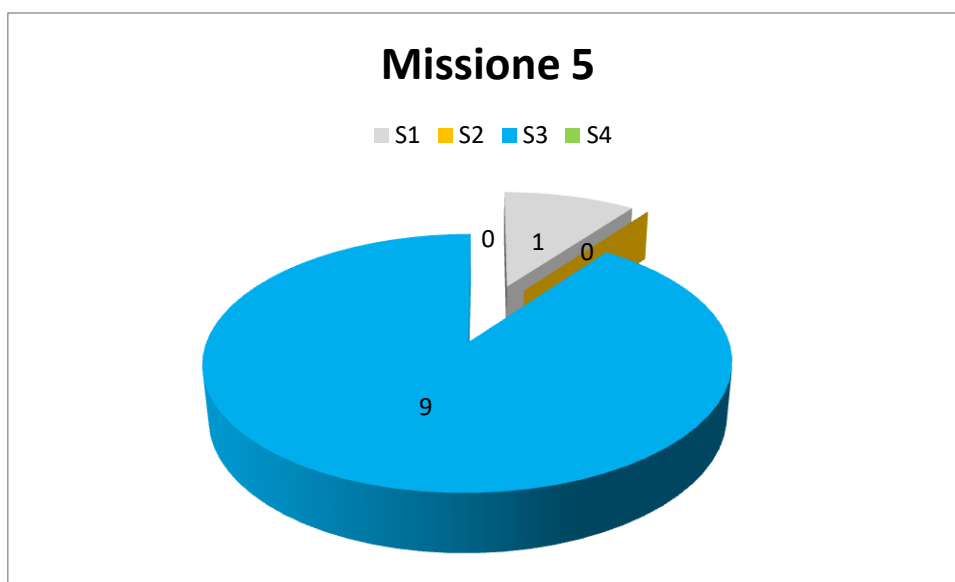



22. TABELLA STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI FONDO COMPLEMENTARE E SUPPORTO

Le tabelle che seguono illustrano lo stato di avanzamento dell'unico intervento finanziato dal PNRR- FONDO COMPLEMENTARE per stadio di avanzamento che è terzo step, lavori avviati, mentre il progetto di supporto è concluso e rendicontato.

	FONDO COMPLEMENTARE	SUPPORTO
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA		
SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONE E RICERCA FINANZIAMENTI		

23 TABELLA STATO DI ATTUAZIONE DEL TOTALE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

La tabella che segue illustra la suddivisione di tutti gli interventi finanziati dal PNRR per stadio di avanzamento. Su 29 interventi finanziati 4 sono al primo step , 2 al secondo che è contraddistinto dall'aver stipulato un contratto di appalto o di servizio, 17 al terzo che prevede che l'intervento sia stato avviato e 6 all'ultimo in quanto gli interventi sono stati già conclusi.

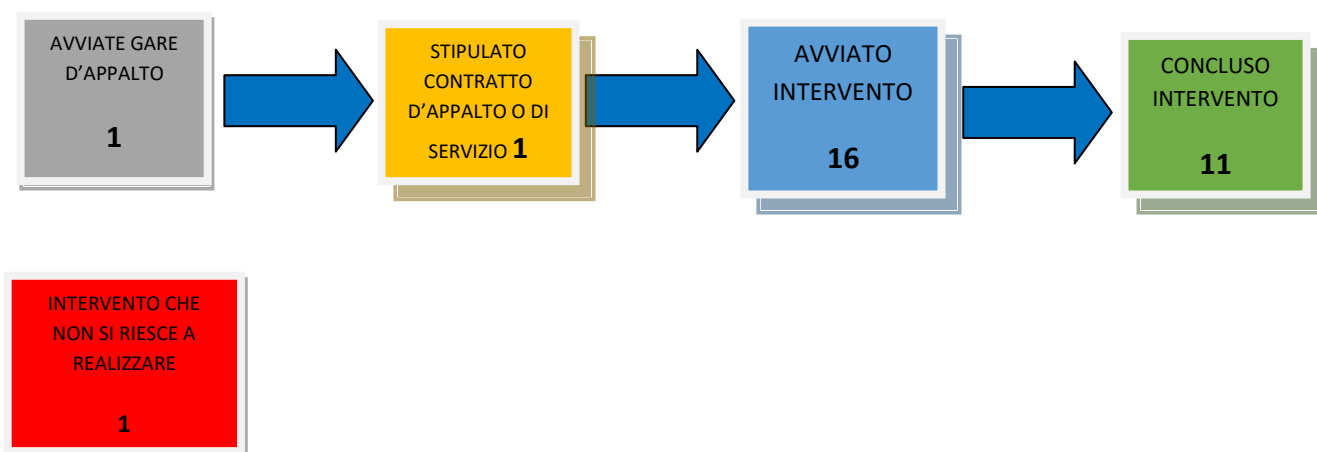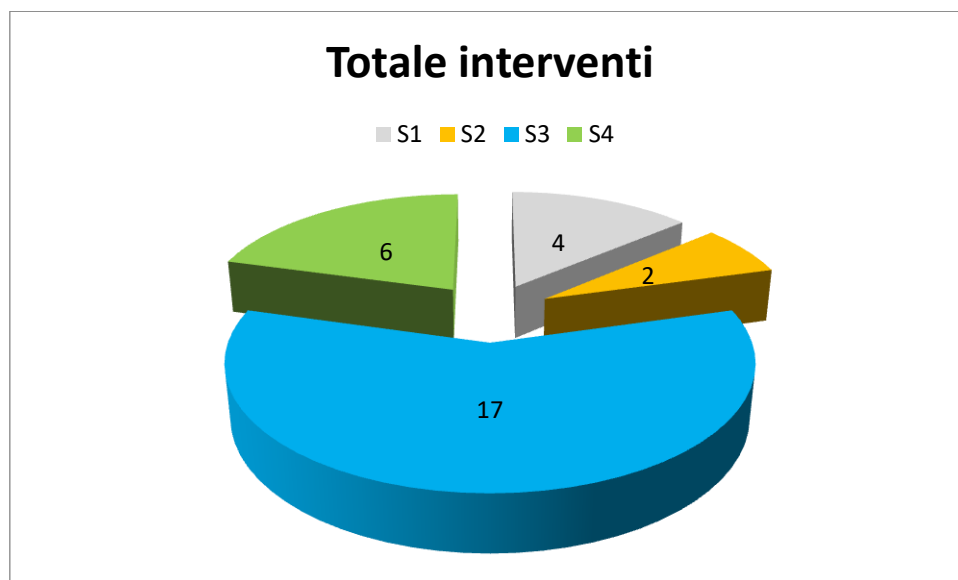

24- LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE

PREMESSA

L'Unione Europea assegna un ruolo primario alla comunicazione, definendo delle precise regole di attuazione quando essa si riferisce a programmi, iniziative o attività che la vedono coinvolta. In quest'ottica **le attività di informazione e comunicazione assumono un ruolo rilevante ai fini dell'efficacia degli interventi**, che devono pertanto coprire l'intero periodo di attuazione delle attività, **garantendo la trasparenza e la visibilità delle operazioni finanziate e dei risultati conseguiti**.

Ogni attività di comunicazione legata a progetti finanziati dal PNRR deve pertanto garantire ai cittadini la **riconoscibilità** del Programma e dell'azione di supporto dell'Unione Europea alle politiche nazionali, rispettando alcuni requisiti.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

a) per ogni tipo di finanziamento dell'UE

Il documento **"The use of the EU emblem in the context of EU Programmes 2021-2027 – Operational guidelines for recipients of EU funding"** del marzo 2021 (reperibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_en.pdf) disciplina le caratteristiche degli elementi grafici da apporre su tutti gli strumenti di comunicazione, nonché sui prodotti e nei luoghi di erogazione dei servizi finanziati dall'Unione Europea.

b) specifici per il PNRR

Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza all'art 34 del Regolamento (UE) 2021/241 detta norme sull'**Informazione, comunicazione e pubblicità**

Alcuni Ministeri per facilitare l'applicazione dei requisiti richiesti dall'UE per le azioni di comunicazione hanno prodotto le linee guida:

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze** : nel documento "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR" allegato alla circolare n. 21 del 14-10-2021 al paragrafo 3.4.1 , pag 77, richiama gli obblighi di comunicazione a livello di progetto;
- **La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport** a febbraio 2023 ha pubblicato il documento "linee guida per le azioni di comunicazione – indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PNRR – Missione 5- Componente 2 – Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale";
- **Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ad aprile 2023 ha pubblicato il documento "Linee Guida per la comunicazione e le azioni informative a cura dei soggetti Attuatori e beneficiari del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (Pnrr)" – versione 1.0;
- **Il Ministero dell'Università e della Ricerca** ad ottobre 2022 ha pubblicato il documento "Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori" – versione 1.0;
- **Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** ha pubblicato il documento "Obblighi di informazione e comunicazione PNRR – ex art. 34, Reg. UE 2021/241";

OBBLIGHI GENERALI PER OGNI TIPO DI FINANZIAMENTO EUROPEO

L'emblema dell'Unione Europea

La **bandiera europea** è il marchio visivo più importante utilizzato per riconoscere l'origine e garantire la visibilità dei finanziamenti dell'UE. L'emblema dell'Unione Europea pronto all'uso, inclusa la **dichiarazione di finanziamento**, può essere scaricato in tutte le lingue dell'UE, arabo, islandese, norvegese, turco e russo dalla [pagina della Commissione europea](https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter): https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter

I beneficiari dei finanziamenti dell'UE hanno l'obbligo di garantire che l'emblema dell'UE sia facilmente visibile all'interno di un dato contesto. Perché ciò avvenga l'UE con il documento **"The use of the EU emblem in the context of EU Programmes 2021-2027 – Operational guidelines for recipients of EU funding"** ha dettato le seguenti regole:

- ❖ L'emblema dell'Unione Europea **non deve essere modificato o unito a qualsiasi altro elemento grafico o testo**.
- ❖ **Se** vengono visualizzati **altri loghi oltre all'emblema dell'UE**, quest'ultimo deve avere almeno le stesse dimensioni come il più grande degli altri loghi.
- ❖ A parte l'emblema dell'UE, **nessun'altra identità visiva o logo può esserlo utilizzato per evidenziare il sostegno dell'UE**.
- ❖ La dicitura **"Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU"** o **"Cofinanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"** deve
 - essere sempre obbligatoria
 - essere scritto per intero
 - tradotto nelle lingue locali
 - essere posta:
 - 1) accanto all'emblema (opzione orizzontale)



**Funded by
the European Union**



**Co-funded by
the European Union**

2) oppure sotto l'emblema (opzione verticale).



**Funded by
the European Union**



**Co-funded by
the European Union**

- ✚ Il **carattere tipografico** da utilizzare per creare la dichiarazione di finanziamento è **Arial (grassetto)**. Offre uno stile semplice e neutro ed è disponibile per tutte le lingue dell'UE. Arial è uno dei font preinstallati dal software Microsoft e Adobe, quindi è facilmente accessibile a tutti. Gli altri font consigliati sono Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu e Verdana.

- La **dimensione del carattere** utilizzato deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.
- La **sottolineatura** e l'**uso di altri effetti** di carattere **non sono consentiti**.

- Il **colore** del carattere deve essere Reflex Blue (lo stesso colore blu della bandiera europea), bianco o nero a seconda dello sfondo.



EU corporate blue
C: 100 | M: 80 | Y: 0 | K: 0
R: 0 | G: 51 | B: 153
#003399



Yellow 100%
C: 0 | M: 0 | Y: 100 | K: 0
R: 255 | G: 204 | B: 0
#FFCC00

- Dimensioni minime** - Il logo dell'UE deve avere la dimensione minima di **1 cm**. Per oggetti specifici, come penne, il logo può essere riprodotto in una taglia più piccola. Quando si utilizza la dichiarazione di finanziamento dell'UE in una piccola dimensione, consigliamo vivamente utilizzando la versione orizzontale.



- Dovrebbe essere garantito un contrasto sufficiente tra l'emblema dell'UE e lo sfondo. Se non c'è in alternativa ad uno sfondo colorato, attorno alla bandiera deve essere posizionato un bordo bianco, con la larghezza di questo essendo uguale a un 25 dell'altezza del rettangolo.
- Quando diverse operazioni si svolgono nello stesso luogo e sono supportate dallo stesso o diversi strumenti di finanziamento, o qualora sia previsto un ulteriore finanziamento per la stessa operazione in un secondo momento, deve essere esposta una sola targa o cartellone.

Da non fare:

Non utilizzare caratteri diversi da Arial, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu o Verdana.	Non usare nessun effetto di carattere
Non aggiungere altri elementi grafici	Non scrivere testi sproporzionatamente più grossi o più piccole rispetto all'immagine del logo
Non usare colori diversi da Blue reflex, bianco o nero	Non modificare le proporzioni del testo
Non scrivere EU. Bisogna sempre scrivere per intero Europea	Non scrivere il testo usando solo caratteri maiuscoli

	
Non sostituire il logo dell'unione europea con quello della commissione europea	Non sostituire il logo dell'UE con ogni altro elemento grafico
	
Non modificare il logo dell'UE	Non aggiungere il nome del programma europeo che finanziava l'attività
	
Non scrivere il nome del programma europeo attaccato al logo dell'UE	Non aggiungere elementi grafici con il nome del programma europeo
	

OBBLIGHI PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR

Il [regolamento UE 2021/241](#) prevede all'articolo 34, paragrafo 2 che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine degli stessi **in tutti i correlati atti amministrativi** (bandi, contratti ecc.) e ne garantiscano la visibilità attraverso il **logo dell'Unione** e una **dichiarazione adeguata sul finanziamento** che reciti «**finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU**», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e tarate su destinatari diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Il **logo Next Generation EU**, versione orizzontale, in italiano è questo:



Le "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" ([Circolare n. 21 del 14.10.2021](#) del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche per i soggetti attuatori) prevedono al punto 3.4.1 che **per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del PNRR debbano riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU**. Sono previste sia la versione orizzontale che quella verticale, entrambe scaricabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos/

(ESTRATTO) 3.4 Altri obblighi e punti di attenzione

3.4.1 Obblighi di comunicazione a livello di progetto

Per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU. Nello specifico i soggetti attuatori dovranno:

- ✓ mostrare correttamente e in modo visibile **in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto** l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"
- ✓ garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, **compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento**)
- ✓ **quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE**
- ✓ Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"

Le linee guida per le azioni di comunicazione – indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PNRR – Missione 5- Componente 2 – Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" prodotte della **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport** a febbraio 2023, per facilitare l'applicazione dei requisiti richiesti e assicurare una visibilità unitaria a tutte le iniziative ad esso correlate è stata creata un'unica immagine con gli elementi grafici indispensabili. Si tratta degli emblemi istituzionali dell'Unione Europea e del Dipartimento per lo Sport, che devono essere pubblicati seguendo un ordine preciso e che dovranno apparire obbligatoriamente su tutti i prodotti di comunicazione.

IL LOGO FIRMA DEL PNRR

DIMENSIONI MINIME



DISTANZA DI RISPETTO

Per garantire la leggibilità del logo è necessario lasciare sempre un'area di rispetto attorno al logo stesso. Elementi grafici o testuali dovranno essere sempre posizionati all'esterno dell'area di rispetto senza interferire con il logo.



In posizione centrale: 1/2 dell'altezza del logo, sopra e sotto, sinistra e destra

INDICAZIONI GENERALI

Il logo firma deve essere:

- sempre a colori, tranne casi giustificati di monocromia;
- in posizione di primo piano, sempre chiaramente visibile;
- di proporzioni adeguate rispetto alle dimensioni del materiale/ documento utilizzato;
- in un sito web, deve essere visibile all'interno dell'area di visualizzazione del dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la pagina verso il basso;

Inoltre:

- quando si ridimensiona, deve rimanere in proporzione e non deve essere distorto;
- deve essere evitata la pixelatura o sfocatura risultante dall'uso di un formato non corretto e/o di una risoluzione insufficiente.

DISPOSIZIONE DEGLI ALTRI LOGHI

versione orizzontale



versione verticale



Quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE. Nel caso in cui il beneficiario non abbia un proprio logo, o nel caso in cui siano presenti i loghi di una pluralità di soggetti coinvolti assieme al beneficiario nell'iniziativa/progetto, in sostituzione del logo potrà essere riportata la dicitura: "L'iniziativa/corso/bando... è organizzato dal progetto XYZ, finanziato nell'ambito del PNRR", corredato dalle informazioni di dettaglio relative alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento.

LOGO UE

Tutte le misure di informazione e comunicazione devono riportare l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dai Regolamenti Comunitari.

L'utilizzo del logo firma, comprensivo del logo UE nelle modalità di cui al paragrafo precedente, consente di soddisfare questi obblighi regolamentari.

L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato.

L'emblema dell'Unione è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.

Quando l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono pubblicati su un sito web, devono essere resi visibili all'interno dell'area di visualizzazione senza che l'utente debba scorrere la pagina verso il basso.

PUBBLICITÀ

Le azioni di pubblicità hanno l'obiettivo di evidenziare l'impegno dell'Unione Europea e degli stati membri nel raggiungimento degli obiettivi. Tali azioni sono programmate in tutte le fasi del progetto e sono volte a garantire la trasparenza delle procedure, informare i cittadini sul sostegno fornito dai fondi, nonché raggiungere tutti i soggetti interessati.

A tal fine, i beneficiari:

- devono fornire sul sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione cofinanziata dal PNRR, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- devono inserire il logo firma su tutti i materiali di comunicazione destinati a far conoscere, promuovere o fornire indicazioni su progetti, prodotti o servizi finanziati nell'ambito del PNRR (manifesti, inviti e programmi convegni, brochure, pubblicazioni, ecc.);

- qualora vengano realizzati video e/o spot televisivi, devono aggiungere al logo firma la seguente dicitura “Realizzato con il cofinanziamento dell’Unione europea, PNRR - Sport e inclusione sociale”; negli spot radiofonici, devono inserire in chiusura il seguente passaggio: “Realizzato con il cofinanziamento dell’Unione europea, PNRR - Sport e inclusione sociale”; nei canali social, devono pubblicare il logo firma nell’intestazione del canale oppure inserire riferimenti al sostegno ottenuto dal fondo nella descrizione testuale del profilo;
- nei gadget di dimensioni ridotte, possono apporre il solo emblema dell’Unione Europea con la dicitura Unione Europea, senza riferimento al PNRR. Se le dimensioni lo consentono, è possibile inserire, il riferimento all’iniziativa a cui il progetto è collegato;
- se i progetti comportano l’acquisto di uno o più oggetti fisici (ad esempio PC, tavoli, sedie, ecc.), devono apporre su tali oggetti un’etichetta standard con i loghi dell’Unione Europea e del PNRR;
- devono collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (minimo in formato A3), in un luogo facilmente visibile al pubblico quale, a titolo esemplificativo, l’area d’ingresso di un edificio, a indicazione del sostegno finanziario dell’Unione;
- apporre sulla cartellonistica di cantiere: la missione, la componente e l’investimento PNRR, il finanziamento erogato in euro, il titolo/descrizione dell’intervento e il logo firma;
- riportare nella documentazione progettuale il logo firma;
- devono assicurarsi che i partecipanti alle operazioni legate al PNRR sappiano che esse sono sostenute da fondi dell’Unione Europea. Pertanto, qualsiasi documento relativo all’attuazione di un’operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dall’UE. In particolare: o devono mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”;
- devono garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l’avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento).

PUBBLICAZIONI

In caso di pubblicazioni o produzione di documenti, i beneficiari sono tenuti ad utilizzare il seguente disclaimer: *“Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”*.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad aprile 2023 ha pubblicato il documento “Linee Guida per la comunicazione e le azioni informative a cura dei soggetti Attuatori e beneficiari del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (Pnrr)” – versione 1.0.

Con esso viene fatto obbligo di utilizzo della **banda dei loghi**

La banda dei loghi o logo firma è la disposizione degli emblemi e dei loghi che deve essere inserita in ciascuna azione informativa o di comunicazione. Nella banda dei loghi sono presenti, in ordine,

- L’emblema dell’Unione Europea completo della dicitura relativa al NGEU
- Il logo del Ministero
- Il logo del PNRR (Italia Domani).

Possono essere aggiunti a seguire il logo del Soggetto attuatore o del beneficiario.



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Città
di
Asti

La banda dei loghi deve essere inserita su:

- ✓ Tutti gli atti prodotti nell'attuazione degli interventi e diretti al pubblico, includendo avvisi, bandi di gara, documentazione contabile, report informativi, presentazioni power point o simili ecc.
- ✓ siti web, etichette, targhe, cartelloni e manifesti (slides successive),
- ✓ comunicati stampa
- ✓ prima di copertina di pubblicazioni cartacee
- ✓ copertina di pubblicazioni digitali o multimediali
- ✓ spot televisivi
- ✓ post con grafica sui social media
- ✓ materiali prodotti per eventi (totem, banner, locandine, brochure, etc.)

SITI WEB

Durante l'attuazione di un progetto, il Soggetto Attuatore informa il pubblico inserendo nel proprio sito web una breve descrizione del progetto per cui ha ottenuto il sostegno finanziario. Nella descrizione vanno inseriti le finalità, i risultati attesi e, successivamente, i risultati raggiunti - coerentemente con quanto previsto dal Pnrr - evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea. In ciascuna pagina web relativa a un progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siano esse di primo o secondo livello, deve essere inserita la banda dei loghi. Idealmente, la pagina web contiene un adeguato rimando (link) al portale di ItaliaDomani e all'Amministrazione titolare dell'intervento, ovvero il Ministero.

TARGHE, CARTELLONI E MANIFESTI

Durante l'attuazione di un investimento o operazione, il Soggetto attuatore informa il pubblico collocando in un luogo facilmente visibile almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) o un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o operazioni di costruzione.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il Soggetto attuatore espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che consista nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione. La targa o il cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.


**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Codice Progetto:

[Nome del beneficiario e titolo del Progetto]

Obiettivo principale dell'operazione

Inserire una breve descrizione

foto
opera/progetto

foto
opera/progetto

foto
opera/progetto

Inserire qui tutte le informazioni e indicazioni previste dalla normativa vigente sui cantieri (es. Architetto, impresa, etc.)


Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti


Italiadomani
INNOVATION

Altro logo



Si ricorda che come tutti gli altri obblighi connessi all'utilizzo dei fondi comunitari, la mancata applicazione delle regole descritte determina il mancato riconoscimento delle spese da parte della Commissione europea e, conseguentemente, la revoca dei finanziamenti concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tutti gli adempimenti relativi alle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli della spesa.
